


市町村名		北谷町									
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】											
事業番号・事業名	1-③		サンセットビーチ改良事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(ウ)					
	担当部署名	建設経済部 土木課		事業実施(予定)年度	平成29年度～令和7年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客受入体制の整備				
事業内容		サンセットビーチは、これまで部分的な改良をしてきたがその都度新たな課題が出るなどを繰り返しているため、ビーチ全体の改良として本事業を行う。本事業において、当ビーチを整備拡充することで観光客受入体制を整え、観光誘客を図る。					Ⅲ-1-(1)				
	効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度)									
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()										
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R2年度		R2年度(繰越)		R3年度		R3年度(繰越)		R4年度	
		(a)当初予算額	203,268	-	502,372	-					
	(b)予算現額	257,001	-	410,489	-						
	(c)増減額(b-a)	53,733	-	▲91,883	-					0	
	(d)繰越額	-	121,279	-	343,576						
	A.計(b+d)	257,001	121,279	410,489	343,576					0	
	B.執行済額	135,722	106,586	158,796	251,693						
	うち交付金充当額	108,577		127,036	105,347						
	次年度繰越額	121,279	-	343,576							
	執行率(%) (B/A)	52.8%	87.9%	38.7%	73.3%					#DIV/0!	
予算の状況の説明	・埋立工事に伴う公有水面埋立手続きに当たり、沖縄県との調整に約5カ月の不測の日数を要したため、年度内の執行率が上がらず、工事前払い金158,796千円のみでの執行となった。また、同理由により、年度内の事業が完了が困難となり、251,692千円を令和4年度に繰越した。										
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)			達成状況							
	令和2年度サンセットビーチ改良事業。 離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工			R2年度		R3年度		R2年度		R3年度	
				目標	離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工						
	実績	離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工の完了									
令和3年度サンセットビーチ改良事業。 護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工			R2年度		R3年度		R2年度		R3年度		
			目標		護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工						
実績		護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工の完了									
達成状況説明	R3年度改良工事において、護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工を完了した。										
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)			基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R5年度)			
	サンセットビーチ改良工事のうち、離岸堤工、第一突堤工、第二突堤工の竣工。			目標	()	(完了)	()	()			
				実績	/	完了		/			
	サンセットビーチ改良工事のうち、護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工の竣工。			目標	()	(完了)	()	()			
				実績	/	完了		/			
【参考指標】 サンセットビーチ年間利用者数 ※ビーチ利用者数を成果目標として設定。			目標	()	()	()	(330,000人)				
実績	/	116,047人	97,388人	/							
進捗状況説明	R3年度改良工事において、護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工を完了した。										

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<p>・埋立工事に伴う公有水面埋立手続きにあたり、沖縄県との調整に約5カ月の不測の日数を要した。</p>	<p>・早期の発注を行うことで、通常の工期に加え、関係機関との調整時間を確保する必要がある。</p>
今後の取り組み方針		
<p>・工事の発注時期を早める取り組みを行う。また、関係機関との調整の有無を把握し、事前に工事の説明を行い、当事業への理解・協力を得る等事業進捗を円滑にするための取り組みを行う。</p>		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
423,329	410,489	232,383	178,106	12,840

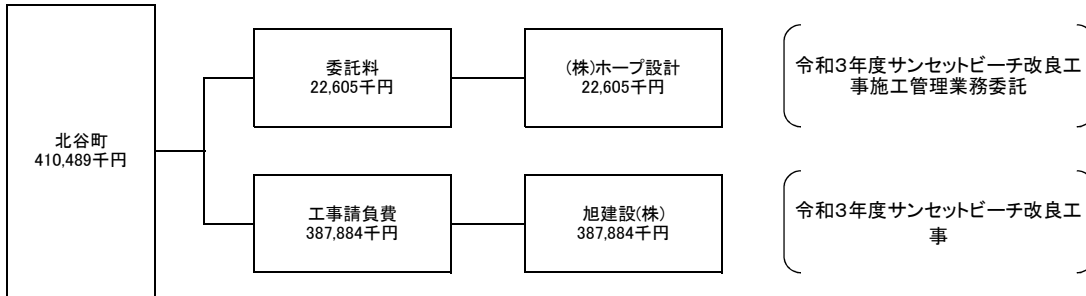


資金の 用途の 流れ、 費目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	<p>○請負業者は町の指名業者選定委員会にて企業組織、実績、知識等を助案した上で選定されており、妥当であったと考えている。</p> <p>○予算規模は、事業内容に見合った適正な規模で確保されており、妥当であった。</p> <p>○費目・使徒については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認し、適正であった。</p>
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名		北谷町					
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-④	パークゴルフ場整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(エ)		
担当部署名	建設経済部 土木課	事業実施(予定)年度	令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客受入体制の整備		
事業内容	嘉手納飛行場に隣接し、観光地形成が遅れている砂辺地区にパークゴルフ場を整備することで、同地域への観光客の回遊促進と地域住民の健康増進を図る。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R3年度	R3年度(繰越)	R4年度	R5年度	R6年度	
		(a)当初予算額	231,199				
		(b)予算現額	191,372				
		(c)増減額(b-a)	▲39,827	0			
		(d)繰越額		160,104			
		A.計(b+d)	191,372	160,104			
		B.執行済額	71,095	120,277			
		うち交付金充当額	56,876	67,124			
		次年度繰越額	160,104				
		執行率(%) (B/A)	37.2%	75.1%			
予算の状況の説明		・管理棟(プレハブ造)には、中国から輸入している資材を使用しており、新型コロナウイルス感染症の影響により仕入れが遅れたため、年度内の執行率が上がらず、工事前払い金71,095千円のための執行となった。また、同理由により、年度内の事業が完了が困難となり、120,277千円を令和4年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
	・パークゴルフ場整備工事 芝舗装工、安全施設工、植栽工 施設工	目標	芝生舗装工、安(全施設工、植栽)工、施設工、				()
		実績	芝生舗装工、安全施設工、植栽工、施設工				
	・備品購入 事務用備品、芝管理用機械 クラブセット	目標	備品購入				
実績		備品購入の完了					
達成状況説明	R3年度改良工事において、護岸工、浚渫工、湧水対策工、造成工、養浜工を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R3年度	R2年度	R3年度	目標値(R5年度)
	パークゴルフ場整備工事の竣工。 備品購入、納品。	目標	()	(完了)	()	()	()
		実績	/	完了			/
	パークゴルフ場年間利用者数 ※パークゴルフ場利用者数を成果目標として設定。 町内9,000人/年 町外6,000人/年	目標	()	()	()	()	(15,000人)
		実績	/				/
パークゴルフ利用者に健康に対する意識が図られたか(80%以上)を含め、アンケートにより、本事業のあり方について検証する。	目標	()	()	()	()	(80%以上)	
	実績	/				/	
進捗状況説明	R3年度整備工事において、芝生舗装工、安全施設工、植栽工、施設工、備品購入を完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・管理棟(プレハブ造)には、中国から輸入している資材を使用しており、新型コロナウイルス感染症の影響により仕入れが遅れた。	・早期の発注を行うことで、通常の工期に加え、不測の事態にも対応する時間を確保する必要がある。
今後の取り組み方針		
・工事の発注時期を早める取り組みを行う。また、関係機関との調整により不測の事態についての可能性を把握し、事業進捗を円滑にするための取り組みを行う。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
191,372	191,372	124,000	67,372	

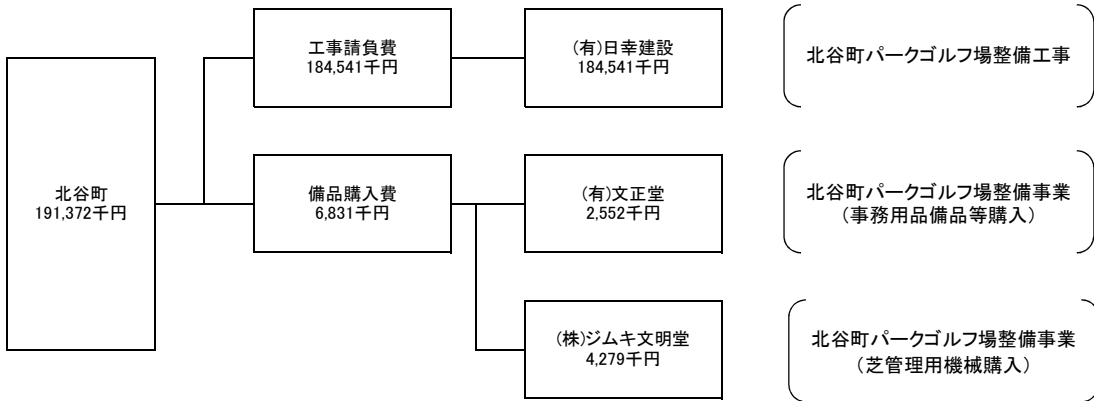

資金の 用途の 流れ、 費目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○請負業者は町の指名業者選定委員会にて企業組織、実績、知識等を助案した上で選定されており、妥当であったと考えている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○予算規模は、事業内容に見合った適正な規模で確保されており、妥当であった。
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・使徒については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について額の確定時において支出等に関する書類により確認し、適正であった。
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
