


# 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会

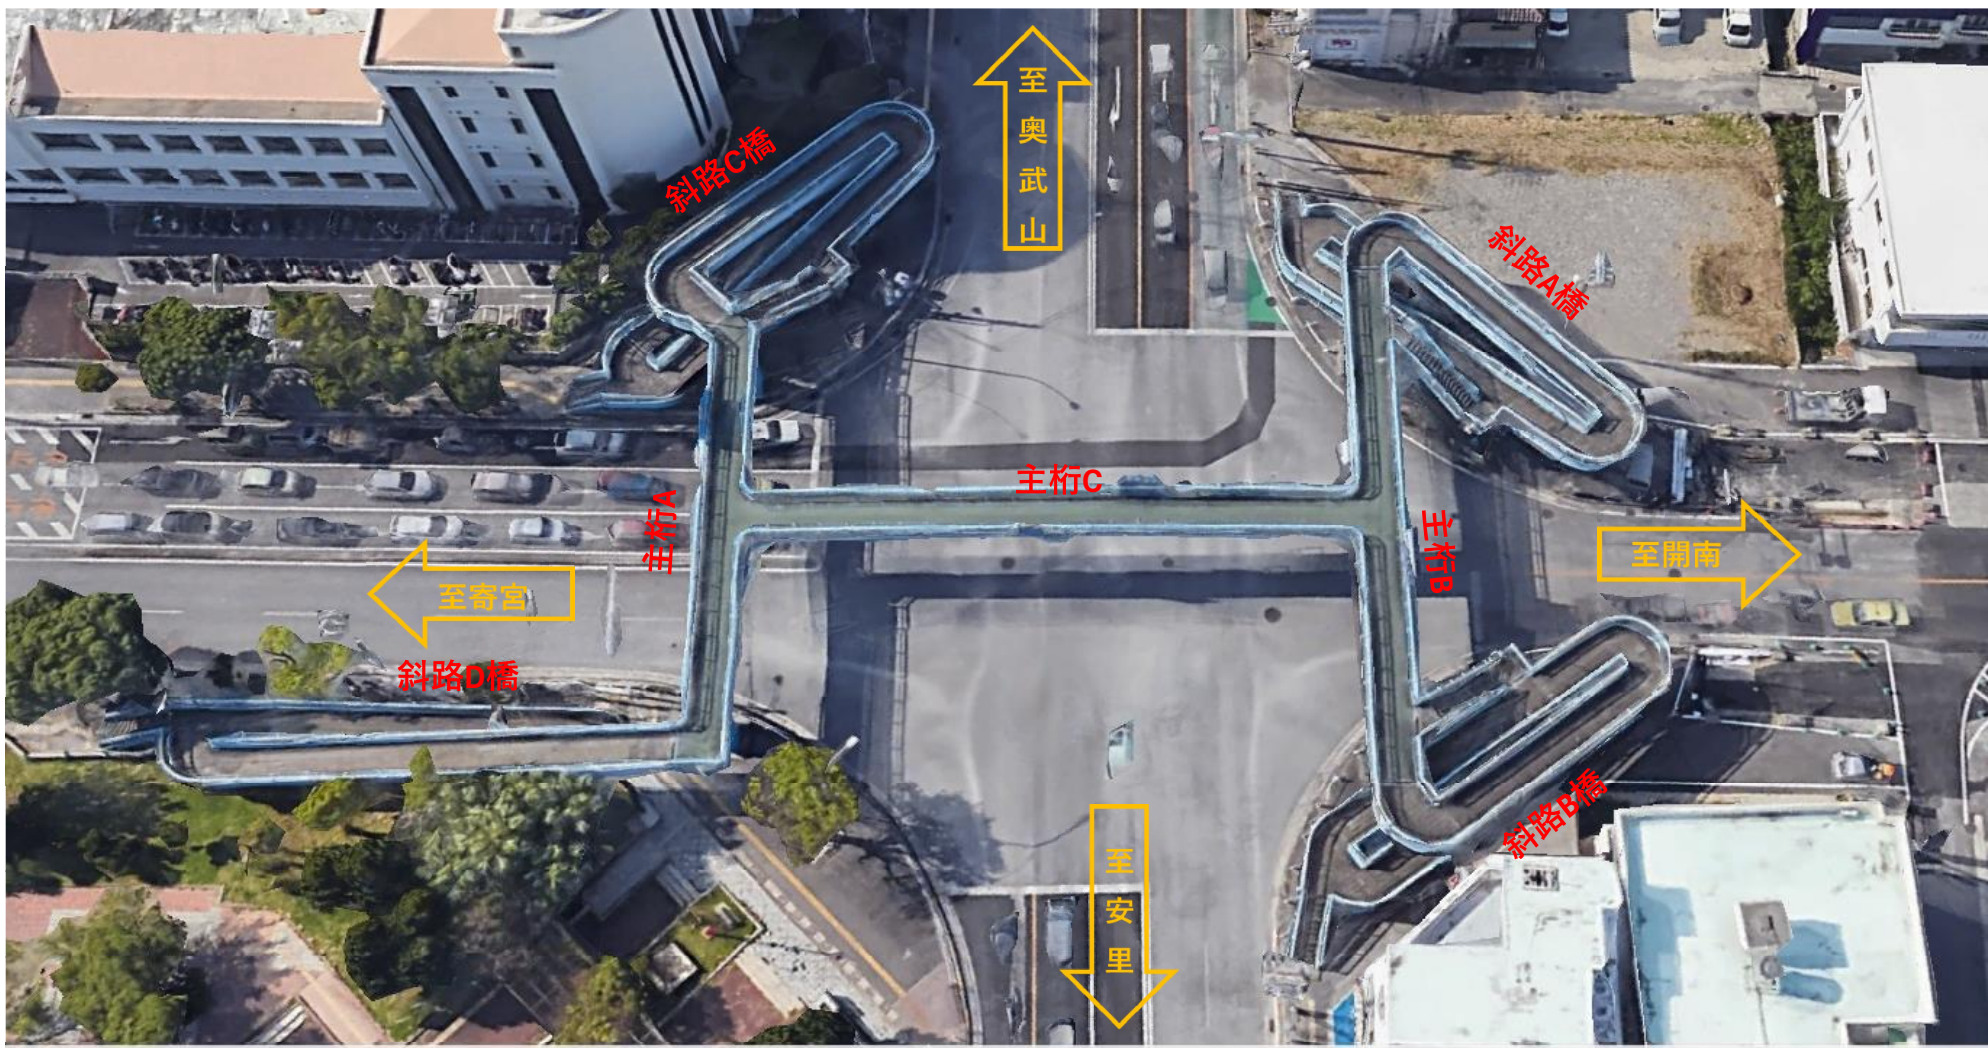

南部土木事務所 街路公園班

# 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会


## 1. 工事概要

- ・本工事は沖縄県の街路事業真地久茂地線（開南工区）の工事であり、与儀横断歩道橋撤去及び開南側道路拡幅まで工事を予定しています。
- ・工期は令和6年5月29日より開始し完了予定は令和7年2月28日を予定してましたが、関連工事である沖縄電力の電柱電線移設工事に遅延（R6.9完了→R6.11完了）が生じておりそれに伴い本工事完了は令和7年6月末頃まで延期する予定です。
- ・与儀横断歩道橋の撤去に伴い、撤去区分を下図の通り7つに区分して施工を予定しています。

那覇警察署前歩道橋




寄宮側

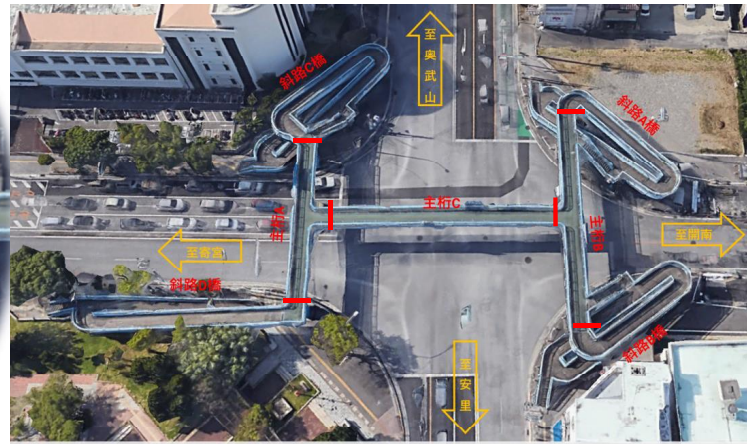

元バイク店前




開南側



主桁B

与儀公園前歩道橋



国道330号横断部



写真屋さん前








南部土木事務所 街路公園班

# 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会

## 2. 工事内容及び関連工事関係

- ・支障となる電柱電線（NTT・沖縄電力）の移設工事があります、別途業者での施工ですが関連工事です。（R6.11月末頃完了予定）
- ・横断歩道の設置及び信号機移設等は本工事にて施工で行い下請け業者の祖慶電設が施工予定です。
- ・与儀横断歩道橋撤去・与儀交差点開南側の道路拡幅工事・与儀交差点～開南交差点の区画線設置を施工します。

沖縄電力・NTT業者による  
電柱・電線の移設（関係工事）

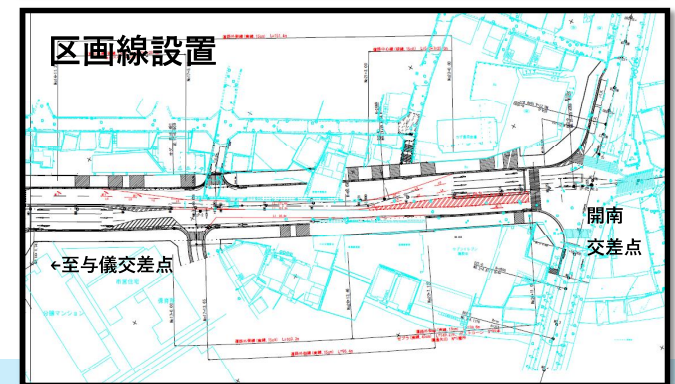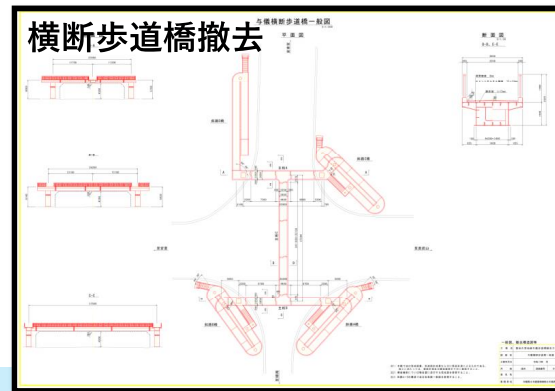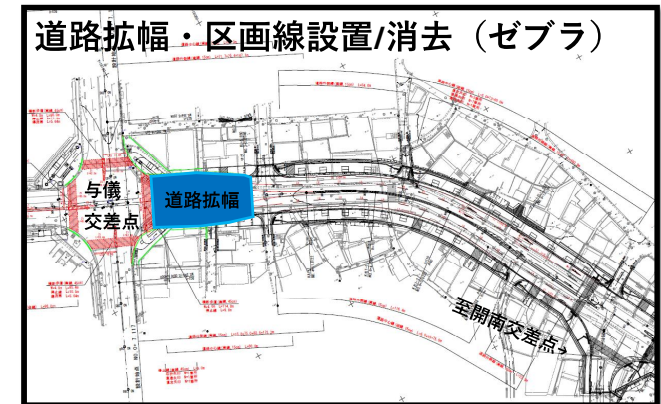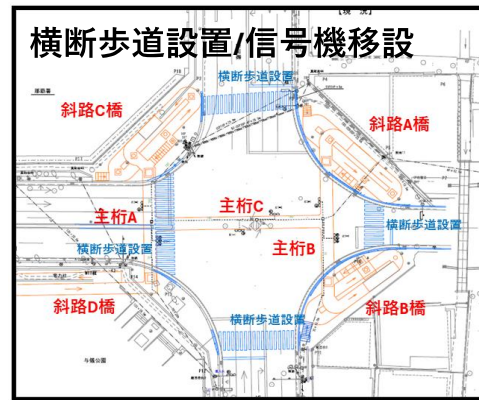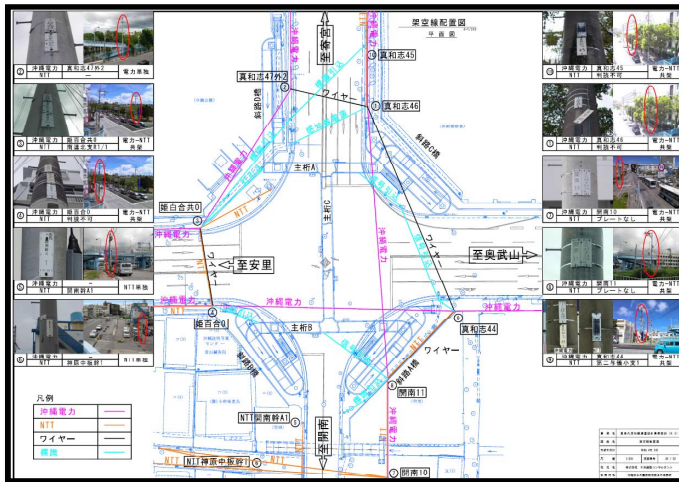

南部土木事務所 街路公園班


# 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会

## 3. 工事順序時期及び道路規制について

\* 施工時期、順序について変更が乗じる場合もあります適時、沖縄県ホームページにて掲載いたしますので、ご確認頂けますようご協力をお願いします。

現場施工時期については、安全第一に地域環境、交通渋滞対策状況に細心の注意を払いながら工事を進めていく所存であります。

下記の予定は現段階で沖縄電力の電柱電線移設工事の完了が令和6年11月末完了予定での施工予定時期となります。電柱電線移設工事の遅れや天候の影響等により遅れが生じることがありますので、何卒、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

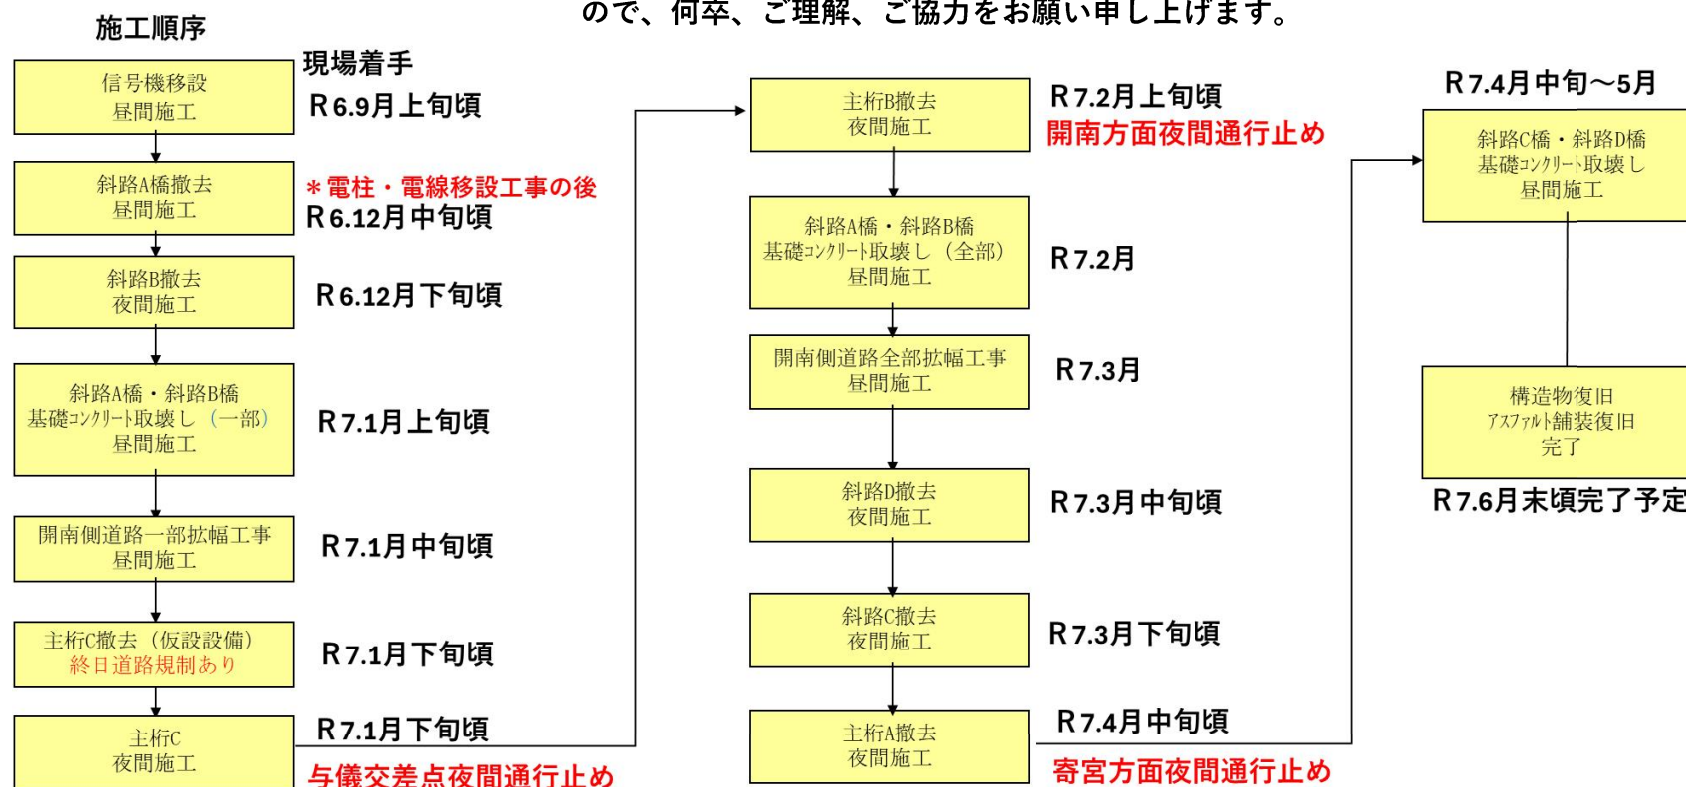


南部土木事務所 街路公園班


# 真地久茂地線与儀歩道橋撤去工事（R6）について工事説明会

道路規制方法は交通状況考慮し状況に応じて時間帯、規制方法が変更となる場合があります。


## 4-1. 工事範囲及び交通規制について

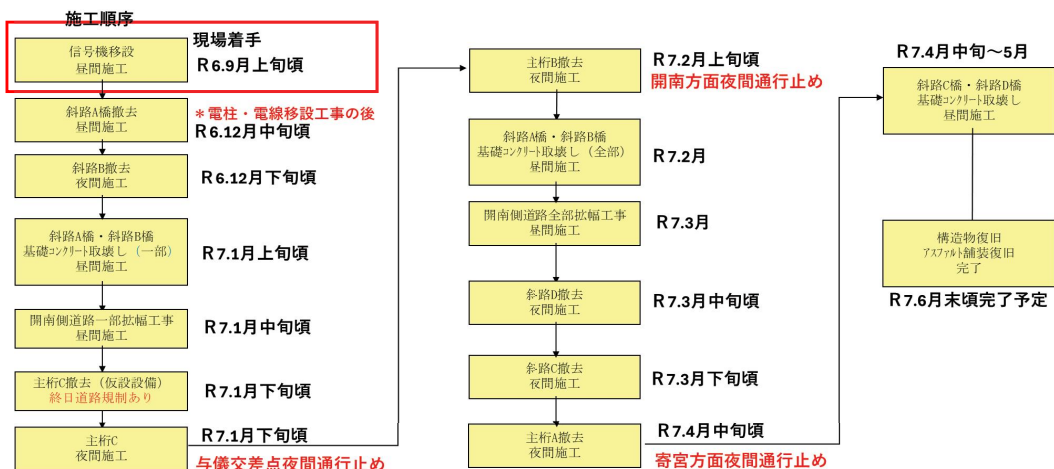


仮設横断歩道設置に伴う交通規制（約40日間）  
 歩道部規制、交通誘導員による歩行者の誘導（約40日間）  
 車道部規制、各交差点外側車線（約5日間）  
 車道部規制、横断歩道区画線設置各車線1車線規制（約8日間）  
**横断歩道設置後は、歩道橋の利用ができなくなります。**

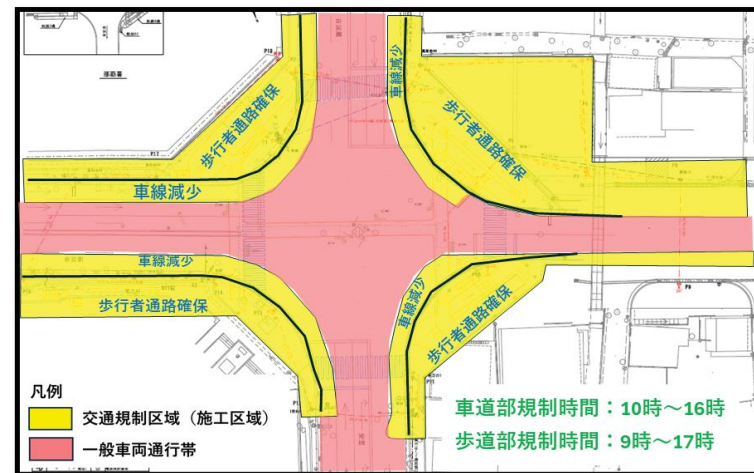

### 横断歩道設置（昼間施工）

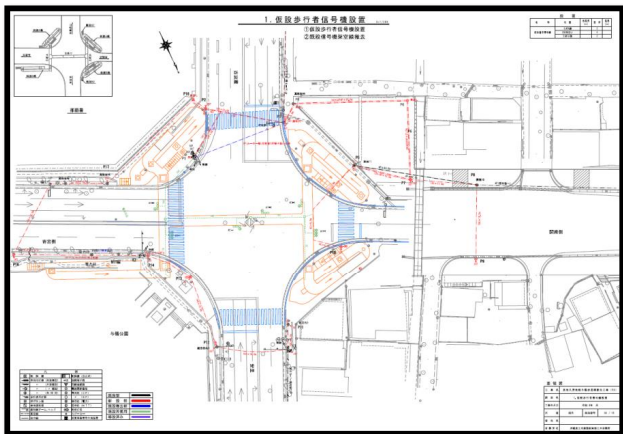

### 開南側歩道部規制工事ヤード設置（R6.9月～R7.2月頃）

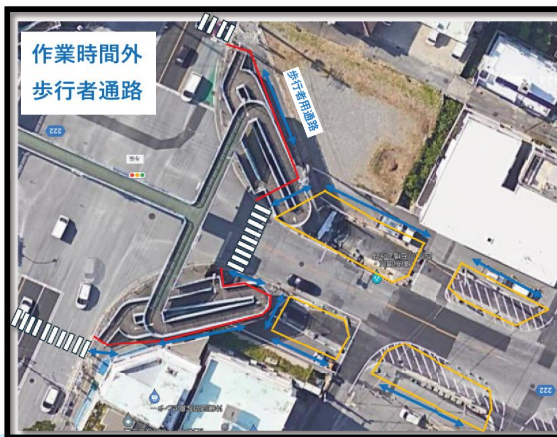

南部土木事務所 街路公園班
