

市町村名		国頭村					
令和3年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-①	スポーツコンベンション観光振興事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(1)-イ		
	担当部署名	企画商工観光課	事業実施(予定)年度	平成25～令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	「スポーツアイランド沖縄」の形成 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	スポーツ合宿の実施増加を図るため、野球場電光掲示板の整備や投てき競技(ハンマー投げ、円盤投げ、砲丸投げ)の練習場(投てき場、ハンマー投げ・円盤投げ用囲い及びサークル含む)を整備する。 また、陸上競技場トラックの改修に向け、実施設計を行う。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和4年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
		(a)当初予算額		15,605	156,308	113,200	287,702
	(b)予算現額		15,605	138,008	118,756	277,250	
	(c)増減額(b-a)		0	▲18,300	5,556	▲10,452	
	(d)繰越額		-	-			
	A.計(b+d)		15,605	138,008	118,756	277,250	
	B.執行済額		14,049	135,115	103,839	277,250	
	うち交付金充当額		11,238	108,092	83,071	221,438	
	次年度繰越額		-	-	-		
	執行率(%) (B/A)		90.0%	97.9%	87.4%	100.0%	
予算の状況の説明	当初計画していた事業については、計画通りに完了した。 予算の減額については、かいぎんスタジアム電光掲示板改修工事及び工事監理委託の入札残に伴うものである。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	野球場電光掲示板工事の実施	目標	()	()	()	(工事の実施)	
		実績				工事の完了	
	投てき場整備実施設計の実施	目標	()	()	()	(設計の実施)	
		実績				設計の完了	
	投てき場整備工事の実施	目標	()	()	()	(工事の実施)	
		実績				工事の完了	
	投てき場備品購入	目標	()	()	()	(備品購入)	
		実績				備品購入の完了	
陸上競技場トラック整備実施設計	目標	()	()	()	(実施設計)		
	実績				設計の完了		
達成状況説明	・野球場電光掲示板工事、投てき場実施設計及び工事、投てき場備品購入業務、投てき場備品購入及び陸上競技場トラック整備実施設計について、計画通り実施することができた。						
R3成果目標(指標)			基準値(年度)	R1年度	R2年度	R3年度	目標値(R4年度)
	野球場電光掲示板工事の完了	目標	()	()	()	(工事の完了)	()
		実績					工事の完了
	投てき場整備実施設計の完了	目標	()	()	()	(実施設計の完了)	()
実績						実施設計の完了	


成果目標 (指標) 及び進捗状況	投てき場整備工事の完了	目標	()	()	()	(工事の完了)	()	
		実績				工事の完了		
	投てき場備品購入の完了	目標	()	()	()	(備品購入の完了)	()	
		実績				備品購入の完了		
	陸上競技場トラック整備実施設計の完了	目標	()	()	()	(実施設計の完了)	()	
		実績				実施設計の完了		
	【R4成果目標】 合宿誘致件数:56件以上	目標	()	()	()	()	(56件以上)	
		実績						
	進捗状況説明	<p>・野球場電光掲示板工事、投てき場整備設計、工事及び陸上競技場トラック実施設計業務、投てき場備品購入について、計画通り実施することができ、施設利用者へ安全安心、快適な施設を提供することができた。</p>						

	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	<p>・スポーツ合宿の実施チームの増加につなげるため、野球場電光掲示板及び投てき場の整備により、電光掲示板についてはプロ野球キャンプ時に球団に利用を提供することができた。また、投てき場についても、実業団・大学等の合宿チームをはじめとして施設使用者へ快適な施設利用を提供することができた。</p> <p>・陸上競技場トラック改修実施設計を実施し、令和4年度に実施予定の工事に向け計画通りに事業を進めることができた。</p>	<p>・野球場電光掲示板及び投てき場の整備により、村内外の施設利用者へ快適な施設環境の提供、省エネに努め光熱費のコスト削減を図る。また、施設の機能が向上したことを周知することにより、さらなる県内外の合宿及び大会等の誘致、村内イベント等の開催に繋げる。</p>
今後の取り組み方針		
<p>・施設の機能が向上したことに伴い、さらなる施設の有効利用を推進するため、スポーツ合宿が集中する冬春季だけでなく、年間を通じた施設の利用促進を図り、県内中学・高校及び大学等の合宿誘致や大会の開催誘致に取り組む。</p>		

資金の流れ

(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		交付金	市町村負担金	
277,250	277,250	221,438	55,812	

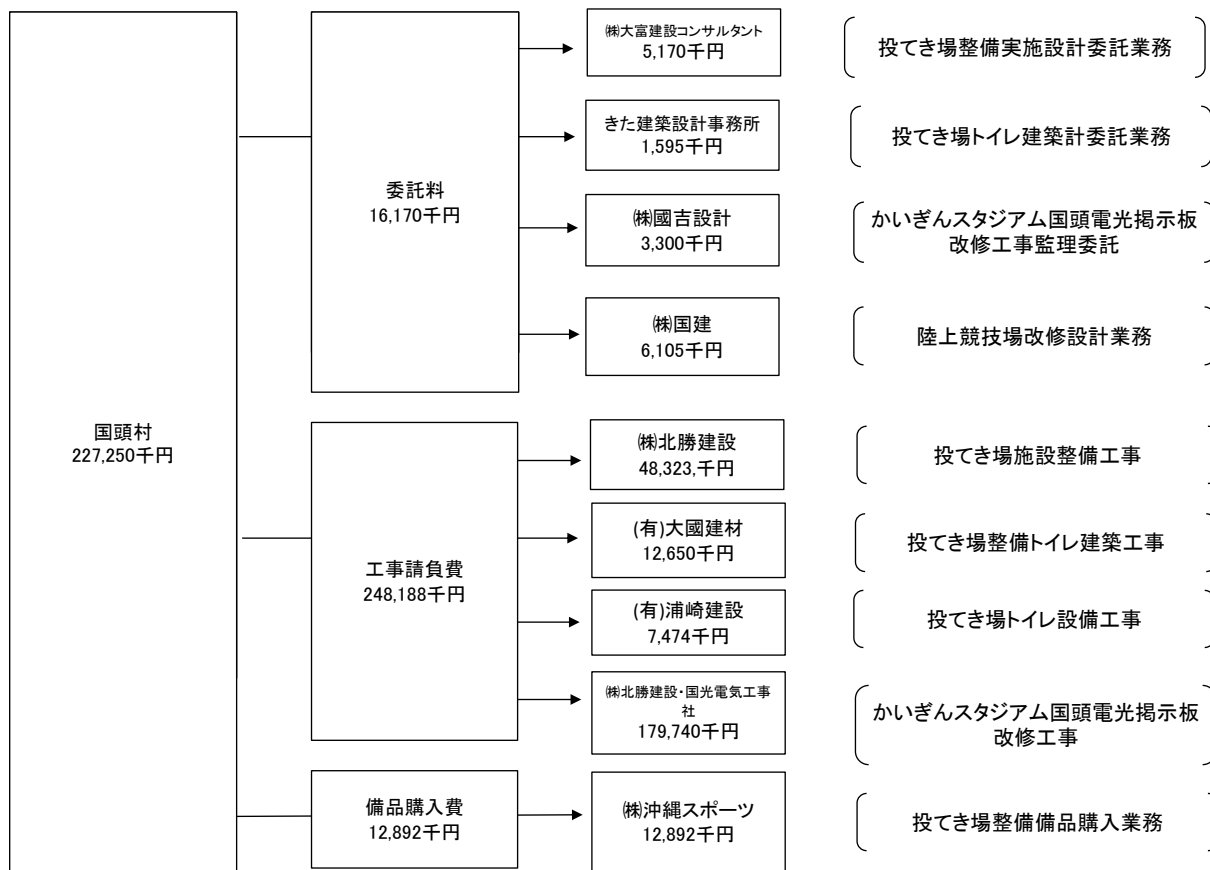


資金の用途の 流れ・費目・ 点検・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事施工事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○不用額はなく適正な規模であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名		国頭村					
令和3年度沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	3-①	多自然川づくり事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(7)-イ		
担当部署名	建設課	事業実施(予定)年度	平成24~令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	交流と共創による農産漁村の活性化 Ⅲ-1-(1)		
事業内容	観光誘客や環境教育の場としての活用を図るため、中心市街地を流れる普通河川(辺土名川)の整備を行う。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和4年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		H30年度	H30年度(繰越)	R1年度	R2年度	R3年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	195,536	-	108,226	70,000	8,000
		(b)予算現額	205,943	-	108,226	70,000	8,952
		(c)増減額(b-a)	10,407	-	0	0	952
		(d)繰越額	-	77,888	-		
		A.計(b+d)	205,943	77,888	108,226	70,000	8,952
		B.執行済額	128,055	76,700	108,107	60,072	8,952
		うち交付金充当額	102,444	61,360	86,485	48,057	7,162
		次年度繰越額	77,888	-	-		
		執行率(%) (B/A)	62.2%	98.5%	99.9%	85.8%	100.0%
予算の状況の説明	上流部L=87mの区間において、プロムナード(散策路)の整備を追加したことにより952千円の増加となった。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	
	河川工事の実施(L=87m)	目標	(河川工事の実施(L=245m))	(河川工事の実施(L=85m))	(河川工事の実施(L=178m))	(河川工事の実施(L=87m))	
		実績	河川工事の実施 L=268m	河川工事の実施 L=97m	河川工事の実施 L=57m	河川工事の実施 L=87m	
		目標	()	()	()	()	
実績							
達成状況説明	・河川工事について、L=87mの整備を実施した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R1年度	R2年度	R3年度	目標値(R4年度)
	河川工事整備率 100%(890m/全体延長L=890m)	目標	()	(61% 734m)	(76% 912m)	(100% 890m)	()
		実績		62% 746m	66% 803m	100% 890m	
	【R4成果目標】 整備した河川沿いにある商店街の観光誘客イベント参加者数 720人	目標	()	()	()	()	(720人)
		実績					
	【R4成果目標】 整備した河川での環境学習参加者数20人	目標	()	()	()	()	(20人)
実績							
進捗状況説明	・河川整備について、目標通り達成できた。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・プロムナード(散策路)の整備を実施したことにより、散歩及びジョギング等で利用している地域住民は増加しているが、コロナウイルス感染拡大の影響により環境学習利用者及び観光客の利用が少ない状況である。	・コロナウイルス感染拡大の影響により環境学習利用者及び観光客の利用が少ないため、商店街の観光誘客イベントの開催及び学校関係への周知を行い利用者の増加に繋げる。
今後の取り組み方針		
・整備した河川沿いのスペースや散策路をより有効活用し、感染対策を徹底しながら商店街の観光誘客イベント及び環境学習を実施し利用者の増加に取り組む。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		市町村負担金		
8,952	8,952	7,162	1,790	



資金の流 れ、費 目・ 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事施工事業者は指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○不用額はなく適正な規模であった。 ○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
