


市町村名		西原町					
令和元年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-③	農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(7)-イ	
担当部署名	建設部 産業観光課	事業実施(予定)年度	平成25～令和2年度		沖縄振興基本方針該当箇所	交流と共創による農山漁村の活性化 Ⅲ-1-(1)	
事業内容	農水産物販売機能やレストラン機能などを併せ持つ施設を整備し、地元農水産物の消費の拡大を図る。						
効果発現年度	<input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H30年度	R1年度	R1年度(繰越)	年度	年度	
		(a) 当初予算額	289,421	658,325			
	(b) 予算現額	147,906	658,325				
	(c) 増減額(b-a)	▲ 141,515	0				
	(d) 繰越額	0	0	410,897			
	A. 計(b+d)	147,906	658,325	410,897			
	B. 執行済額	143,793	247,428	396,153			
	うち交付金充当額	115,034	197,942	316,922			
	次年度繰越額	0	410,897	0			
	執行率(%) (B/A)	97.2%	37.6%	96.4%			
予算の状況の説明	新築2期工事において、設計内容を変更すべき要因により設計仕様の変更に伴い、工事請負費及び工事監理委託業務にかかる410,897千円を令和2年度に繰越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	R1活動目標(指標)	達成状況					
		H30年度	R1年度	年度	年度		
	新築2期(建築・電気・機械)工事及び工事監理委託業務の実施	目標	(—)	(新築2期工事及び工事監理委託業務の実施)	()	()	
		実績	—	新築2期工事及び工事監理委託業務の完了			
	新築1期工事及び工事監理委託業務の実施	目標	(新築1期工事及び工事監理委託業務の実施)	(—)	()	()	
		実績	新築1期工事及び工事監理委託業務の完了	—			
目標	()	()	()	()			
実績							
達成状況説明	新築2期工事(建物上屋・電気・機械工事)及び工事監理委託業務を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R1成果目標(指標)	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	目標値(令和3年度)	
	農水産物流通・加工・観光拠点施設の建設	目標	(実施設計の完了)	(新築1期工事及び工事監理委託の完了)	(新築2期工事及び工事監理委託の完了)		(—)
		実績	実施設計の完了	新築1期工事及び工事監理委託完了	新築2期工事及び工事監理委託完了		—
【令和3年度成果目標】 供用開始後1年目(令和3年度)の目標を以下のとおりとする。 (農水産物販売機能) 年間総売上225百万円 (地域住民が活用できる厨房機能) 年間利用件数96件 (地域情報展示発信機能) 本施設について、来場者へのアンケート調査を実施し、西原町の歴史文化や地域情報が効果的に発信されているか(80%以上)を含め、アンケート調査により、本事業のあり方を検証する。	目標	—	—	—		(販売機能) 売上225百万円 (厨房機能) 利用件数96件 (展示発信機能) 満足度80%	

進捗状況説明	新築2期工事(建築・電気・機械)及び工事監理委託業務が完了した。
--------	----------------------------------

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	建築関連工事については、全国的に作業員の不足や資材の納期遅延が生じていることから、外構工事の円滑な執行に懸念がある。	外構工事の円滑な執行に向けて、早期に事業を進めていく必要がある。

今後の取り組み方針
早期に工事の発注を行うなど、次年度は計画通りに事業を進められるよう適切な工程管理に努める。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

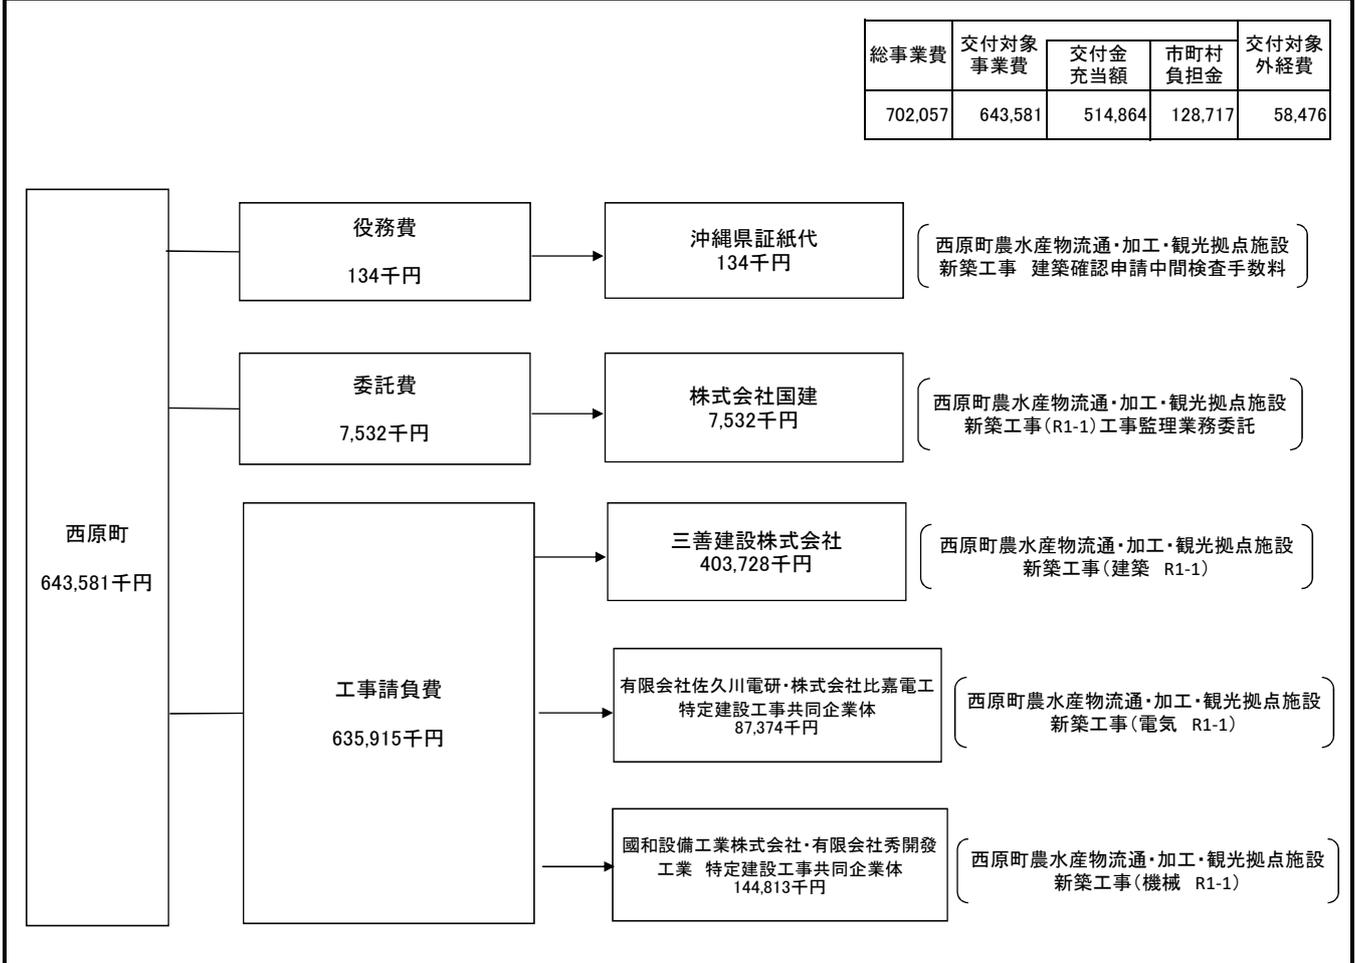

資金の流 れ、費 目・ 点 検 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託の業者選定は、指名競争入札により実施しており、妥当であったと考える。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費用・用途については、事業目的の観点から、必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
