


市町村名		久米島町									
平成29年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】											
事業番号・事業名	5-①		球美の島エコアイランド化推進事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-1-(3)-ア					
	担当部課名	建設課		事業実施(予定)年度	平成24~29年度	沖縄振興基本方針該当箇所	地球温暖化防止対策の推進				
事業内容		低炭素島しょ社会の実現と自然豊かな環境に配慮した島づくりの推進を図るため、町内に設置されている水銀街灯のLED化事業等を実施する。					III-11-(3)				
	効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(30年度)									
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()										
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	H28年度		H28年度(繰越)		H29年度		H29年度(繰越)		H30年度	
		(a) 当初予算額	521,772		—		46,383		—		
	(b) 予算現額	542,257		—		46,302		—			
	(c) 増減額(b-a)	20,485		—		▲ 81		—			
	(d) 繰越額	0		21,629		0		9,060			
	A. 計(b+d)	542,257		21,629		46,302		9,060			
	B. 執行済額	68,667		21,629		37,242		8,069			
	うち交付金充当額	54,933		17,303		29,793		6,454			
	次年度繰越額	21,629		0		9,060		0			
	執行率(%) (B/A)	12.7%		100.0%		80.4%		89.1%			
予算の状況の説明	既存電柱にLEDを取り付けるため、地元自治会との設置に関する調整、協議で不測の時間を要し繰り越したが、予定どおりすべての工事が完了した。工事完了に併せ本事業でH25年度から実施したLED設置工事の台帳作成についても完了した。										
活動目標(指標)及び達成状況	H29活動目標(指標)		達成状況								
			H28年度	H29年度	H30年度	R1年度					
	LED防犯灯を整備・設置	目標	(委託・工事)	(委託・工事)	()	()					
		実績	委託・工事	委託・工事							
		目標	()	()	()	()					
実績											
達成状況説明	当初計画の町内の水銀灯1650灯(H24年度: 310灯、H25年度: 241灯、H26年度: 286灯、H27年度: 376灯、H28年度: 376灯、H29年度114灯)についてはLED灯への切り替えを完了した。										
成果目標(指標)及び進捗状況	H29成果目標(指標)		基準値(年度)	H28年度	H29年度	H30年度	目標値(年度)				
	LED防犯灯整備率: 100% (導入予定: 1, 650灯)	目標	()	(100%)	(100%)	()	()				
		実績		99%	100%						
	【H30成果目標】 CO2削減量	目標	()	()	()	(321,061 kg-CO2)	()				
		実績				321,061kg-CO2					
進捗状況説明	地元自治会との設置に関する調整、LED設置電力申請等で当初計画より時間を要したが、当初計画していた目標は達成できた。										

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	町内に所在する街路灯のLED化は、計画通り完了した。今後は町民にも本事業の事業効果であるCO2削減の取り組みを理解させ、町民自体での自発的な取り組みの推進を図る。	街路灯のLED化による消費電力の削減及びCO2削減の効果をPRし、島内施設内でもLED化を推奨することで、「低炭素島しょ社会の実現」に向けた取り組みを実施する。
今後の取り組み方針		
設置したLED灯の維持管理に努め、自治会とも連携し、修繕、取替作業を実施していく。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

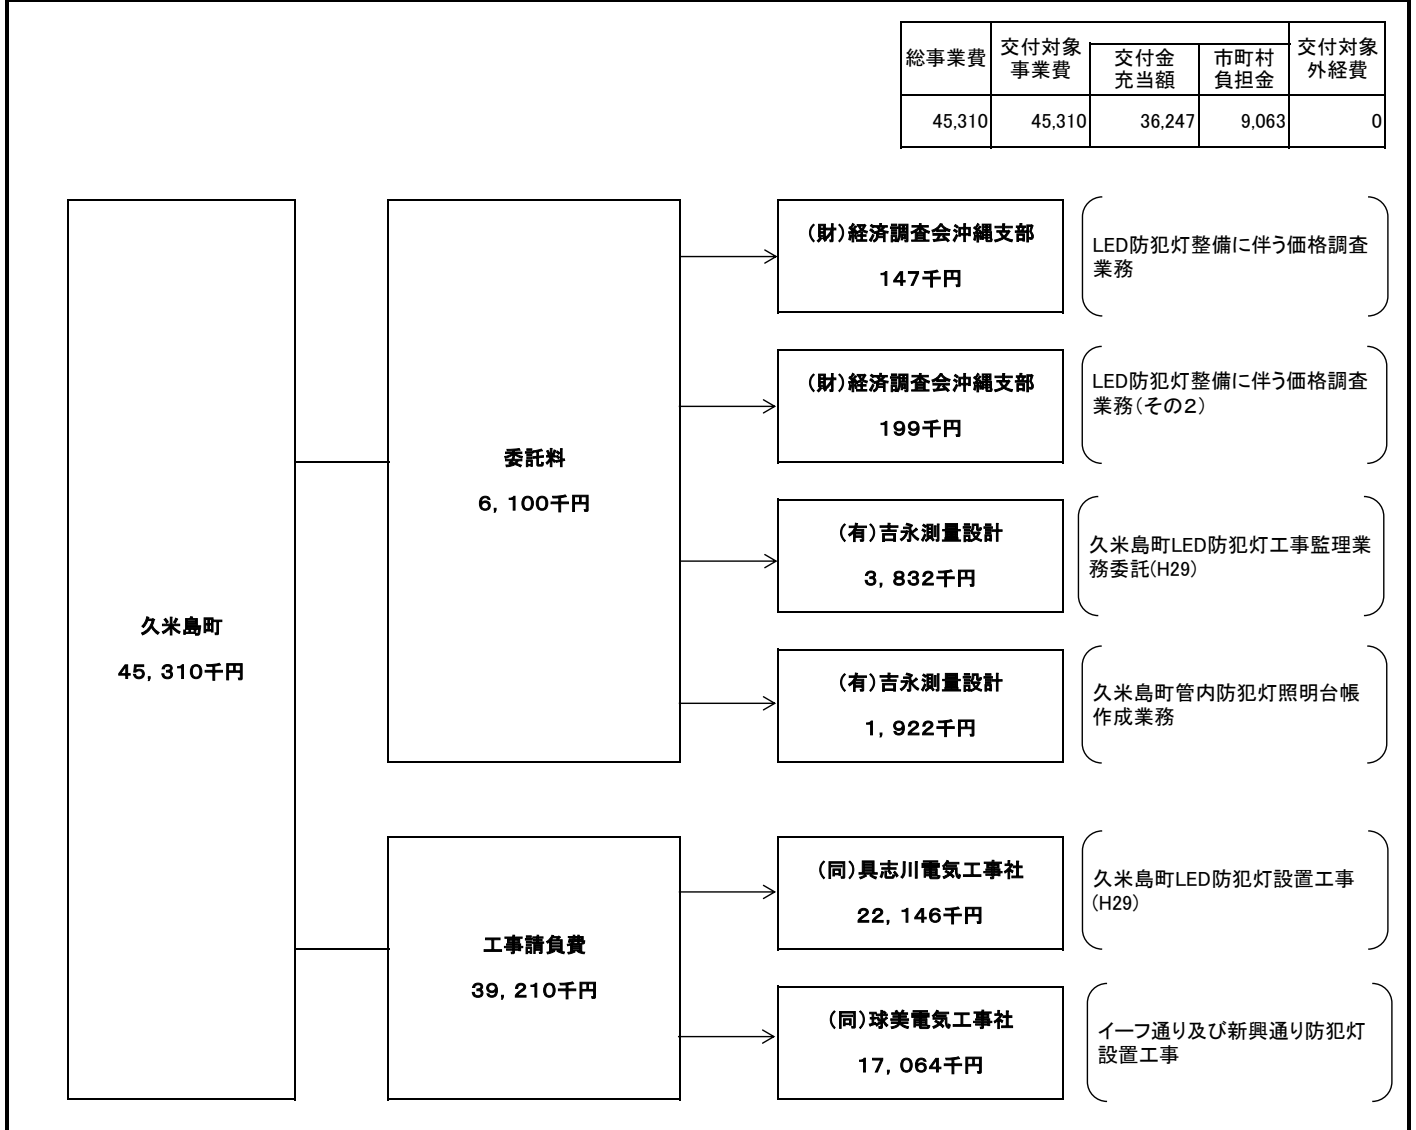

資金の流 れ、費 目・ 点 検 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託事業者・施工業者は指名競争入札により企業組織、実績、知識等を勘案した上で選定しており妥当であったと考えている。 ○予算規模については適正な規模であったと考えている。 ○費目・使途については事業目的達成の観点から必要なものなのか等について確定時において支出の等に関する書類により確認、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
