


市町村名	渡名喜村						
令和2年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	4-①	観光振興整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア		
担当部署名	経済課	事業実施(予定)年度	平成27～令和2年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光リゾート産業の振興		
事業内容	観光案内所や観光スポットである東浜周辺の整備を行うことで、受入体制を整え、観光客の利便性を確保する。						
効果発現年度	<input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(年度)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	(a) 当初予算額	R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R2年度(繰越)	年度
		(b) 予算現額	171,629		135,064		
		(c) 増減額(b-a)	137,649		134,860		
		(d) 繰越額	▲ 33,980	0	▲ 204	0	0
	A. 計(b+d)		61,385		81,620		0
	B. 執行済額	137,649	61,385	134,860	81,620		
	うち交付金充当額	61,985	61,385	53,240	81,620		
	次年度繰越額	49,588	43,744	42,592	65,296		
	執行率(%) (B/A)	70,059	0	81,620	0		
	45.0%	100.0%	39.5%	100.0%			
予算の状況の説明	新型コロナウイルス感染症対策として緊急事態宣言下における来島自粛要請(令和3年1月19日～)に伴い、労務者の確保に不測の日に数を要したことから、年度内の完了が困難となったため、81,620千円を繰越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	R2活動目標(指標)		達成状況				
			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	島尻毛散策道の整備	目標	(実施)	()	()	()	
		実績	実施				
	ターミナル周辺の整備	目標	(実施)	()	()	()	
		実績	実施				
達成状況説明	島尻毛散策道の整備、ターミナル周辺の整備を完了し、目標を達成できた。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R2成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(年度)
	利便性の確保が図られていると評価する観光客の割合80%以上(アンケートにより算出)	目標	()	(80%以上)	()	()	()
		実績		未実施			
	【参考指標】	目標	()	(実施)	()	()	()
		実績		実施			
	進捗状況説明	観光案内所や観光スポットである東浜周辺の整備を行うことで、受け入れ体制を整え、観光客の利便性を確保した。					

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> 観光客の満足度や利便性の向上に向け、継続的な管理が重要となる。また、整備した施設等の利用についても積極的に取り組む必要がある。 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、本村への来島自粛要請が続いている為、成果目標であるアンケート調査の実施ができない状況となっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 整備した施設等の維持管理を徹底するほか観光客向けのツアーやガイド等での利用や情報発信に取り組み利用者数の増加及び満足度の向上に繋げる。 成果目標については、アンケート調査以外に効果的な目標設定が難しいため現状のままアンケート調査を継続する。
今後の取り組み方針		
<ul style="list-style-type: none"> 美化作業等を積極的に行い維持管理に注力するほか、本事業を通して整備した施設等の利用を促進するような取り組みを実施していく。 次年度以降についてもアンケート調査を実施し、成果目標を達成できるよう取り組んでいく。 		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
134,860	134,860	107,888	26,972	

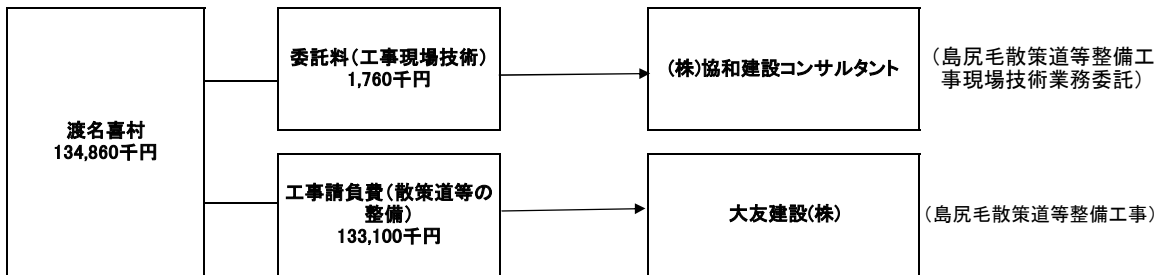


資金の流 れ、費 目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託及び工事の業者選定は指名競争入札により実施しており、妥当であったと考えている。 ○費目、用途について事業目的達成の観点から必検査、確認しており、適正であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名		渡名喜村					
令和2年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	5-①	渡名喜村旅客ターミナル 整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(6)-ア		
担当部署名	総務課	事業実施(予定)年度	平成31年～令和2年度	沖縄振興基本方針該当箇所	地域特性に応じた生活基盤の整備 Ⅲ-9		
事業内容	観光客への情報提供、特産物のPRや販売場所の整備をすることで、利用者の満足度を上げ、観光リピーターの増加とさらなる観光客誘致に繋がるよう、渡名喜村景観村づくり条例や沖縄県福祉のまちづくり条例に沿った旅客ターミナルの建築を行う。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(年度)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R4年度	R5年度	
		(a)当初予算額	283,900				
		(b)予算現額	247,615				
		(c)増減額(b-a)	▲36,285		0	0	0
		(d)繰越額		145,431			
		A.計(b+d)	247,615	145,431	0	0	0
		B.執行済額	91,299	145,531			
		うち交付金充当額	73,039	116,424			
		次年度繰越額	156,316				
		執行率(%) (B/A)	36.9%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
予算の状況の説明		想定外の仮設工事や、コロナ過における作業員の確保等により、不測の日数を要したため、予定していた工期に大幅な遅れが生じ145,431千円を令和3年度に繰越した。					
活動目標(指標)及び達成状況	R2活動目標(指標)		達成状況				
			R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	
	渡名喜村旅客ターミナル改築工事監理業務の実施	目標	()	(工事監理業務の実!)	()	()	
		実績		工事監理業務の完了			
	渡名喜村旅客ターミナル改築工事(建築・電気・機械)の実施	目標	()	(建築工事・電気工事・機械設備工事の実施)	()	()	
		実績		建築工事・電気工事・機械設備工事の完了			
達成状況説明	令和2年度に建築工事、電気工事、機械設備工事、工事監理業務を実施し、令和3年度に工事及び監理業務を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R2成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(年度)
	渡名喜村旅客ターミナル改築工事及び監理業務	目標	()	(工事完了)	()	()	()
		実績		工事完了			
	【参考指標】 渡名喜村旅客ターミナル改築工事及び監理業務の完了	目標	()	(100%)	()	()	()
		実績		100%			
進捗状況説明	渡名喜村旅客ターミナルの建設については、令和3年9月で整備が完了し、同月から供用が開始されている。						

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)		改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	ターミナルの完成により、情報提供や特産品のPR・販売場所の提供が確保されたことから、今後の施設有効利用と利用者の利便性向上について取り組んでいく必要がある。	アンケート等により利用者から意見を聴取し、ターミナルの利便性・満足度確保に向けた取り組みに力を入れる。
	今後の取り組み方針	
渡名喜村のPRや情報提供(パンフレット、ポスター等)を行い、ターミナルにアンケートボックスを設置し利用者に対してアンケート調査を行い、利便性や満足度(80%)確保に向けた取組みを行う。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

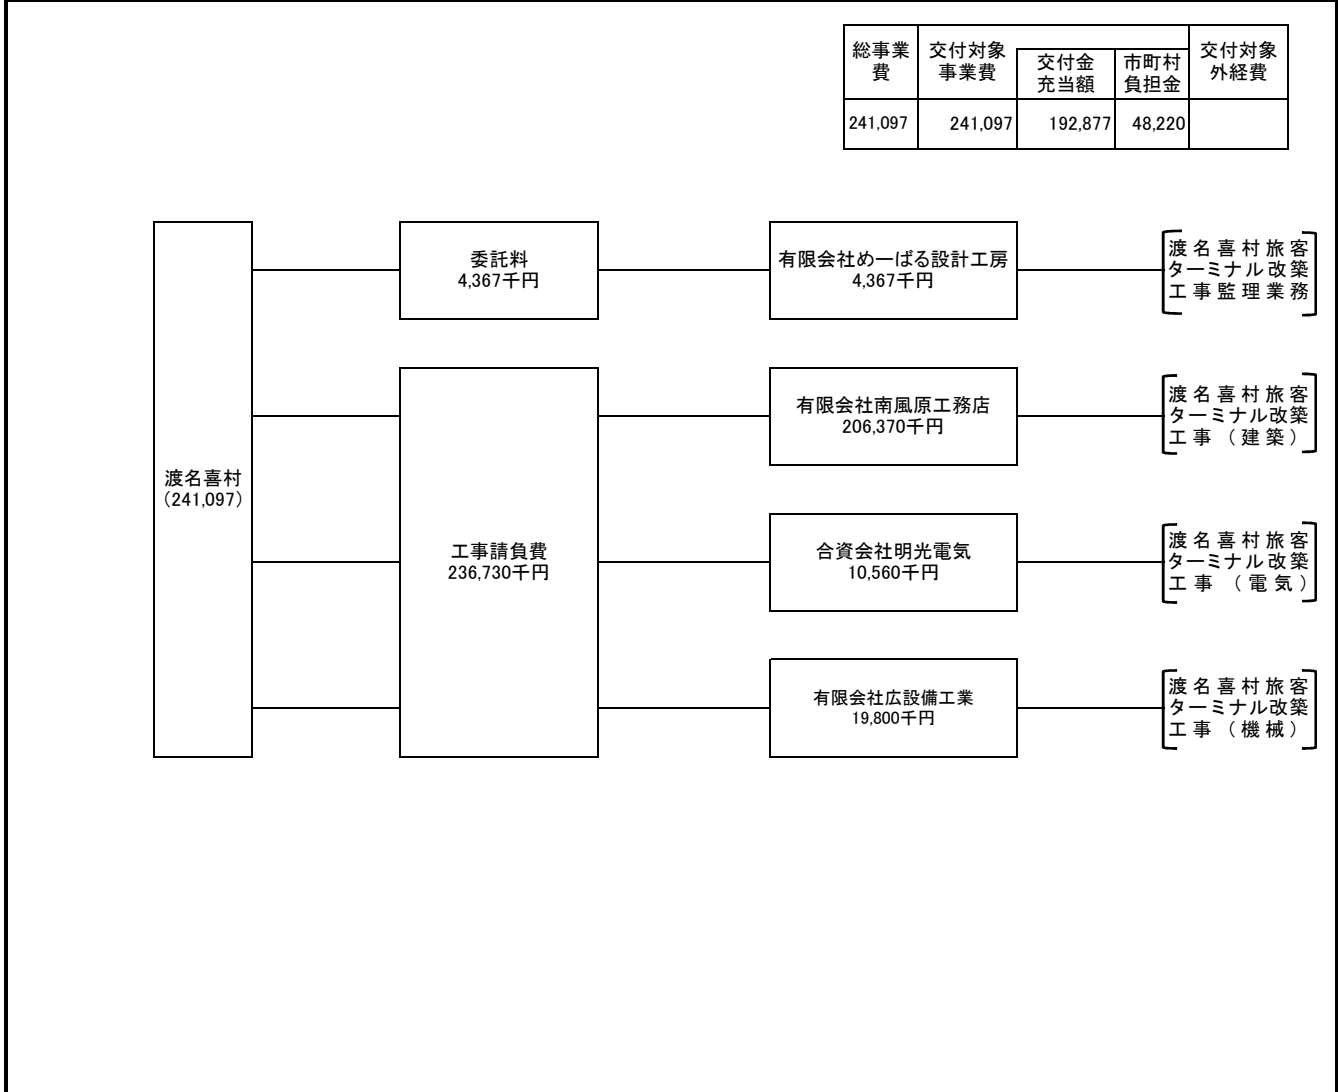


資金の流 れ、費 目・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	<ul style="list-style-type: none"> ・適正に指名競争入札を実施しており妥当である。 ・基本設計、実施設計、検討委員会、住民説明会を実施し事業内容に見合った規模である。 ・請負契約に基づき甲乙同意しており妥当である。 ・本事業の目的に限定されている。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名	渡名喜村						
令和2年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	7-①	渡名喜村多目的拠点施設整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-2-(4)-(イ)	
担当部署名	教育行政課	事業実施(予定)年度	平成26年~令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	災害に強い県土づくりと防災体制の強化 Ⅲ-10(2)、Ⅲ-9、Ⅲ-4		
事業内容	市民の子育て環境の整備、健康増進、観光振興に加え、市民や観光客を自然災害から守るため、子供預かり所、老人福祉施設、歴史民俗資料館、災害時避難施設などからなる多目的拠点施設を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和4年度)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		R1年度	R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R4年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	16,390				
	(b)予算現額	15,510	92,175				
	(c)増減額(b-a)	▲880	92,175	0	0	0	
	(d)繰越額	0	0	51,750			
	A.計(b+d)	15,510	92,175	51,750	0	0	
	B.執行済額	15,510	40,425	51,750			
	うち交付金充当額	12,408	31,020	41,400			
	次年度繰越額	0	51,750	0			
	執行率(%) (B/A)	100.0%	43.9%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
予算の状況の説明	悪天候等による資料採取の遅れや、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納期の遅延が生じたため、不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため、51,750千円を令和3年度に繰越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	R2活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	渡名喜村歴史民俗資料館の実施設計業務、展示制作工事及び工事監理業務委託の実施	目標	(基本設計の実施)	(実施設計業務、展示制作工事、工事監理業務の実施)	()	()	
		実績	基本設計の完了	実施設計業務、展示制作工事、工事監理業務の実施			
		目標	()	()	()	()	
	実績						
達成状況説明	令和2年度内に完了はできなかったが、令和3年度に完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R2成果目標(指標)		基準値(年度)	R1年度	R2年度	R3年度	目標値(年度)
	渡名喜村歴史民俗資料館の実施設計業務、展示制作工事及び工事監理業務委託の実施	目標	()	(設計完了)	(実施設計、工事、工事監理業務の実施)	()	()
		実績		完了	実施設計、工事、工事監理業務の実施		
	【参考指標】	目標	()	()	()	()	()
		実績					
進捗状況説明	令和2年9月に実施設計業務、令和3年7月に展示制作工事、工事監理業務が完了した。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・渡名喜の歴史、民俗、自然について、村民及び村出身者がアイデンティティーを形成し、渡名喜について誇りを抱けるような資料館にしていく。 ・子どもたちの学習の場、村民が交流し、活動できる場、観光客に渡名喜の魅力を発信し、村づくり、村おこしにつながるような資料館にしていく。	「基本計画」及び「展示基本計画」を基に、展示構想、造形制作、映像制作、資料収集について、検討委員会で審議を重ねていく。
今後の取り組み方針		
令和3年度の事業完了に向けて、展示構想、造形制作、映像制作、資料集について、検討委員会等で審議を重ね、資料館建築に取り組む。		

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金充当額		交付対象外経費
		交付金充当額	市町村負担金	
92,175	90,525	72,420	18,105	1,650

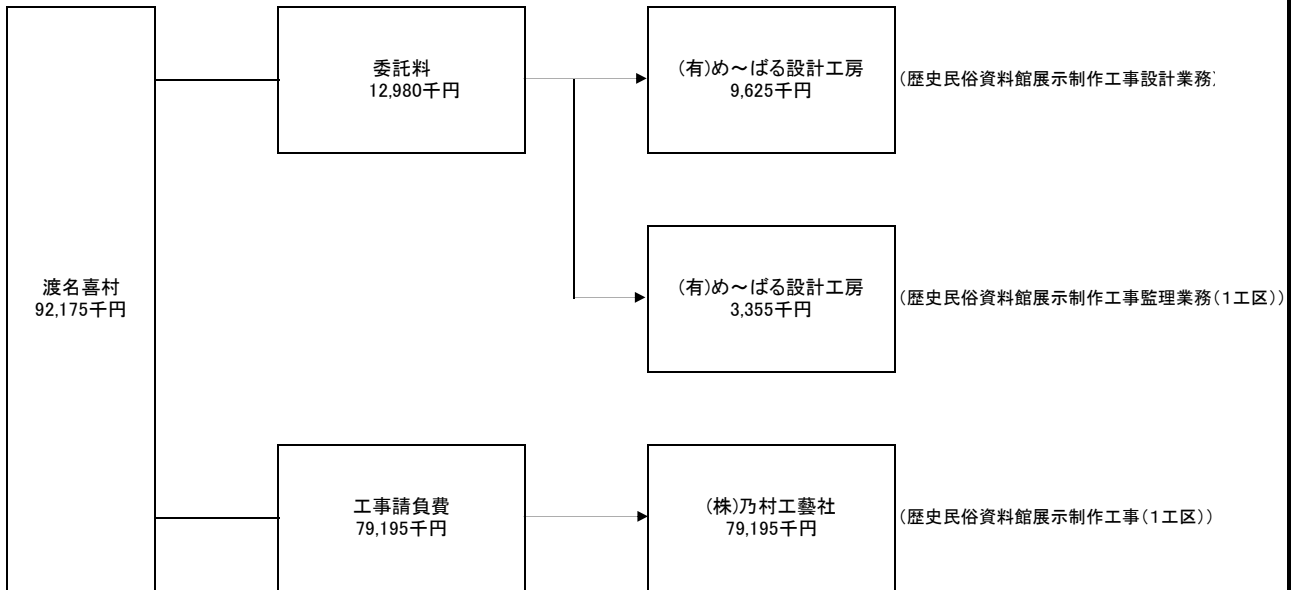

資金の流 点検 費目・	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	・適正に指名競争入札を実施しており妥当である。 ・検討委員会において協議を重ね、事業内容、目的に見合った規模等を検討しており、適正である。 ・請負契約に基づき甲乙同意しており妥当である。 ・費目、用途は事業の目的に沿っており、適切である。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
