

市町村名		那覇市					
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-5	亜熱帯庭園都市の公園美化事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(I)	
担当部署名	都市みらい部 公園管理課		事業実施(予定)年度	平成24~令和3年度		沖縄振興基本方針該当箇所	観光客受入体制の整備
事業内容	観光客が快適に公園利用することで沖縄観光のサービス向上につながるように、観光地周辺における松山公園・漫湖公園トイレのバリアフリー化や和式便器から洋式便器への整備、新都心公園内植栽樹木の剪定による樹幹形成や伐採を行い、快適な公園環境の創出やイメージアップを図る。						
効果発現年度	■当年度      □後年度(      年度)						
実施方法	■直接実施      ■委託      □補助      □負担      □その他(      )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況		R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)
		(a) 当初予算額	45,000		13,050	87,970	
	(b) 予算現額	45,000		13,050	85,205		
	(c) 増減額(b-a)	0		0	▲ 2,765	0	
	(d) 繰越額		20,000	0	0	53,285	
	A. 計(b+d)	45,000	20,000	13,050	85,205	53,285	
	B. 執行済額	24,986	18,843	12,982	31,920	53,285	
	うち交付金充当額	19,989	15,074	10,385	25,536	42,627	
	次年度繰越額	20,000	0	0	53,285	0	
	執行率(%) (B/A)	55.5%	94.2%	99.5%	37.5%	100.0%	
予算の状況の説明	・R3年度は、工事発注時は想定していなかったアスベストの含有が既存建物に確認されたことから、請負業者によるアスベスト除却を含む便所整備工事を行うこととなったため繰越した。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	R4年度(繰越)	
	・便所整備工事の実施(漫湖公園2棟、松山公園1棟)	目標	( 便所整備1棟実施 )	( 植栽剪定業務1公園実施 )	( 便所整備3棟、植栽剪定業務1公園実施 )	( 便所整備3棟実施 )	
・植栽剪定業務の実施(実施場所:新都心公園)	実績	実施	実施	植栽剪定業務実施	実施		
達成状況説明	便所整備工事3棟(漫湖公園、松山公園)を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R4年度)
	・便所整備工事100%完了(予定箇所総数15箇所、令和2年度までの整備累計12箇所)	目標	( )	( 便所整備80%完了、植栽剪定90%完了 )	( 便所整備100%完了、植栽剪定100%完了 )	( 便所整備100%完了、植栽剪定100%完了 )	( 便所整備100%完了、植栽剪定100%完了 )
	・植栽剪定100%完了(予定箇所総数11箇所、令和2年度までの整備累計10箇所)	実績	/	完了	便所整備80%完了、植栽剪定完了	完了	/
	【参考指標】 ①トイレが整備されたことにより利便性が確保されたか、②観光地として、相応しい公園景観であると感じるか(満足度80%以上)を含め、観光客等へのアンケート調査により、本事業の在り方を検証する。	目標	( )	( 満足度80%以上 )	( 満足度80%以上 )	( 満足度80%以上 )	( 満足度80%以上 )
		実績	/	未実施	未実施	90%以上	/
進捗状況説明	・便所整備工事を完了した。便所整備100%完了(予定箇所総数15箇所、令和3年度までの整備累計15箇所) ・新都心公園の植栽補植業務が完了した。植栽剪定100%完了(予定箇所総数11箇所、令和3年度までの整備累計11箇所) ・令和4年度にアンケート調査を行った結果、漫湖公園、松山公園ともに90%以上の利用者が使いやすい、綺麗と回答しており、また、観光の魅力向上についても90%以上がそう思うと回答している。						




市町村名		那覇市					
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-6		福州園再整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-(I)	
	担当部課名	都市みらい部 公園管理課		事業実施(予定)年度	平成28~令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客受入体制の整備 Ⅲ-1-(1)
事業内容	<p>県内唯一の中国式庭園である福州園は、大型旅客船パースが近くにあり外国人観光客も多く訪れる施設として期待されている。観光客を含めた福州園利用者数増加を目的として、夜間の景観演出等、各種イベント会場として使用するため施設に付加価値を付けた機能強化としての再整備事業を行う。</p>						
効果発現年度	<input checked="" type="checkbox"/> 当年度 <input type="checkbox"/> 後年度(    年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他(    )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	
		(a) 当初予算額	45,000	0	40,400	230,200	
	(b) 予算現額	45,000	0	38,400	198,259		
	(c) 増減額(b-a)	0	0	▲ 2,000	▲ 31,941	0	
	(d) 繰越額		45,000	0		93,848	
	A. 計(b+d)	45,000	45,000	38,400	198,259	93,848	
	B. 執行済額	0	43,449	38,181	104,411	93,848	
	うち交付金充当額	0	34,759	30,544	83,528	75,078	
	次年度繰越額	45,000		0	93,848	0	
	執行率(%) (B/A)	0.0%	96.6%	99.4%	52.7%	100.0%	
予算の状況の説明	<p>福州園再整備工事(土木)において一部工法変更を行ったこと等により、31,941千円の減額となった。 R3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により世界的に半導体部品が不足し、本工事で使用する制御盤製作が遅延することとなったため、繰越した。</p>						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度(繰越)	R2年度	R3年度	R4年度(繰越)	
	第3期福州園再整備工事完了		目標 (第1期再整備事業完了)	(第2期再整備事業完了)	(第3期再整備事業完了)	(第3期再整備事業完了)	
		実績	完了	完了	一部完了	完了	
達成状況説明	第3期再整備事業(土木、電気、設備工事)を完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R4年度)
	福州園再整備事業の完了(工事3件、監理業務1件)		目標 ( )	(工事2件、監理業務1件)	(工事3件、監理業務1件)	(工事6件、監理業務2件)	(工事6件、監理業務2件)
			実績	50%	50%	100%	
	【参考指標】利用者数:100,000人		目標 ( )	( )	( )	(100,000人)	(100,000人)
			実績			58,364人	
進捗状況説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>第3期再整備事業を完了し、令和4年7月8日にリニューアルオープンした。</li> <li>利用者数について、令和4年度の目標値100,000人に対し、実績値58,364人となり、約58%の達成率となった。</li> </ul>						

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)		改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	(福州園再整備事業の完了) ・夜間の景観演出等、各種イベント会場として使用するため施設に付加価値を付けた機能強化としての再整備事業の完了により、今後当該施設の活用に向け、適切な維持管理を行う必要がある。	(福州園再整備事業の完了) ・適切な維持管理を行う。
	(利用者数) ・事業の繰越によりリニューアルオープンが7月となったこと、また、令和4年7月～9月は沖縄県医療非常事態宣言の発出もありコロナ前の水準に戻っていないことから、目標値には達しなかったが、利用者数は順調に推移している。今後は目標値達成のため誘客について、指定管理者と調整する必要がある。	(利用者数) ・イベントの企画・開催や情報発信の強化により広報活動を行い、更なる利用者数の増につなげる。
今後の取り組み方針		
<p>(福州園再整備事業の完了) 継続的に適切な維持管理を実施していく。</p> <p>(利用者数) イベントの企画・開催や情報発信の強化により、広報・PR活動を継続して実施し、利用者数の増へつなげる。</p>		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>総事業費 (千円)</th> <th>交付対象 事業費</th> <th>交付金 充当額</th> <th>市町村 負担金</th> <th>交付対象 外経費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>198,259</td> <td>198,259</td> <td>158,606</td> <td>39,653</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	総事業費 (千円)	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費	198,259	198,259	158,606	39,653	0
総事業費 (千円)	交付対象 事業費	交付金 充当額	市町村 負担金	交付対象 外経費										
198,259	198,259	158,606	39,653	0										
<p>那覇市 198,259千円</p>	<p>工事請負費 196,554千円</p>	<p>(株)大宜見組 91,420千円</p>	〔 令和3年度福州園再整備工事 (土木) 〕											
		<p>(資)明光電気 36,063千円</p>	〔 令和3年度福州園再整備工事 (機械) 〕											
		<p>光電気工事(株) 69,071千円</p>	〔 令和3年度福州園再整備工事 (電気) 〕											
	<p>委託料 1,705千円</p>	<p>(株)設備研究所 1,705千円</p>	〔 令和3年度福州園再整備工事業務委託(監理) 〕											
	資金の 使途の 流れ、 点検 評価・ 費目	評価	点検項目	評価に関する説明										
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○委託の業者選定は、本市で選定した業者を一般競争入札により実施しており、妥当であったと考える。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	○事業年度に見合った予算規模で適正であったと考える。											
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目、使途については、事業目的の観点から、必要なものなのか等については額の確定時において検査、確認しており、適正であった。											
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。												

市町村名	那覇市						
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-18	第一牧志公設市場再整備推進事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(8)-イ		
担当部署名	経済観光部 なはまち振興課	事業実施(予定)年度	平成26~令和3年度	沖縄振興基本方針該当箇所	商店街・中心市街地の活性化と商業の振興 Ⅲ-1-(1)		
事業内容	第一牧志公設市場の再整備にあたり、再整備期間中、仮設市場において市場機能を維持することにより、賑わいの継続及び観光客の誘客を図るため、仮設市場の賃貸借業務及び必要な商業支援を実施。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度)						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他( )						
予算額・執行額 【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		H30年度(繰越)	R1年度	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	
	予算の状況	(a) 当初予算額	-	251,142	162,512	149,944	-
		(b) 予算現額	-	153,881	162,512	149,944	-
		(c) 増減額(b-a)	-	▲97,261	0	0	-
		(d) 繰越額	162,078	0	0	0	6,900
		A. 計(b+d)	162,078	153,881	162,512	149,944	6,900
		B. 執行済額	162,078	146,316	156,990	142,989	6,769
		うち交付金充当額	129,662	117,052	113,758	114,391	5,415
		次年度繰越額	0	0	0	6,900	0
		執行率(%) (B/A)	100.0%	95.1%	96.6%	95.4%	98.1%
予算の状況の説明	新市場の供用開始時期の遅延に伴い繰越した商業支援については、事業計画どおり執行した。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			H30年度	R2年度	R3年度	R4年度(繰越)	
	仮設市場賃貸借の実施	目標	/	賃貸借実施	賃貸借実施	賃貸借実施	
		実績	/	実施	実施	実施	
	商業支援業務等の実施	目標	業務の実施	業務の実施	業務の実施	業務の実施	
		実績	実施	実施	実施	実施	
達成状況説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設市場の賃貸借業務については、現年度内に令和3年度分を実施した。</li> <li>新市場の供用開始時期の遅延に伴い繰越した商業支援については、市場事業者に対する新市場への円滑な移転のための説明会や相談支援及び移転に向けた広報業務を実施した。</li> </ul>						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R5年度)
	仮設市場賃貸借の実施	目標	( )	( 賃貸借実施 )	( 賃貸借実施 )	( 賃貸借実施 )	( )
		実績	/	実施	実施	実施	/
	商業支援業務等の完了	目標	( )	( 業務の完了 )	( 業務の完了 )	( 業務の完了 )	( )
		実績	/	完了	完了	完了	/
	【R5成果目標】年間来訪者数目標	目標	( )	( )	( )	( )	( 256万人 )
実績		/					
進捗状況説明	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設市場の賃貸借業務については、現年度内に令和3年度分を実施した。</li> <li>新市場の供用開始時期の遅延に伴い繰越した商業支援については、市場事業者に対する新市場への円滑な移転のための説明会や相談支援及び移転に向けた広報業務を実施した。</li> </ul>						

推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)		改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
取組の検証	(仮設市場賃貸借業務の実施) ・新市場の供用開始に伴い賃貸借業務は完了となるため、課題なし。	・市場公式ホームページやデジタルサイネージにて、市場を含めた中心市街地の情報発信を強化することで、市場を含めた中心市街地の賑わいの維持及び観光客の誘客を図る。
	(商業支援業務等の実施) ・新市場への移転が円滑に完了したため、課題なし。	
今後の取り組み方針		
・令和5年度は、市場再整備に伴い撤去されたアーケードの再整備を支援することで、市場を含めた中心市街地の賑わいの維持及び観光客の誘客を図る。		

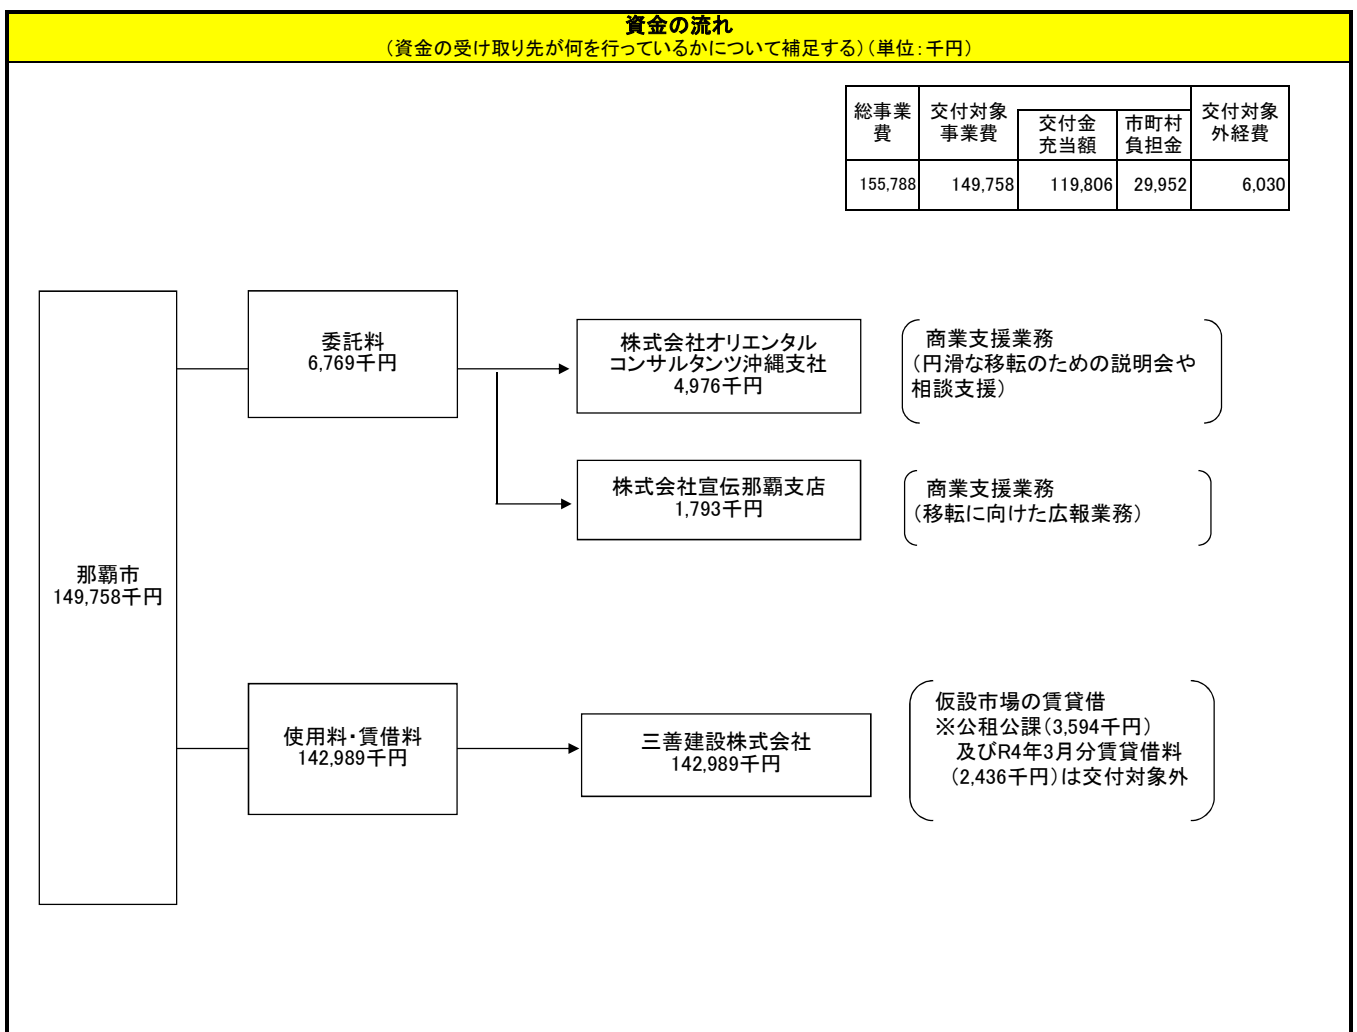

資金の流 れ、 点 検 、 評 価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○事業者は、一般競争入札および地方自治法に基づく随意契約で選定しており、妥当であったと考えている。 ○不用額は事業費の5%以内であり適正な規模であった。 ○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
