

市町村名	座間味村						
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-⑦	阿嘉地区観光道路整備事業		沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(12)-ア		
担当部署名	産業振興課	事業実施(予定)年度	令和3~令和4年度	沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備		
事業内容	観光客の国際化や多様なニーズに対応する為、国指定天然記念物ケラマジカが生息している地域特性を活用した魅力ある癒しの観光メニュー開発を目的とした山林観光道路を整備する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度以降)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> その他(請負工事)						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)		R3年度	R3年度(繰越)	R4年度	R5年度	R6年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	35,594	0			
		(b)予算現額	35,594	0			
		(c)増減額(b-a)	0	0			
		(d)繰越額	0	35,594			
	A.計(b+d)		35,594	35,594			
	B.執行済額		0	35,090			
	うち交付金充当額		0	28,072			
	次年度繰越額		35,594	0			
	執行率(%) (B/A)		0.0%	98.6%			
予算の状況の説明		不用額504円については入札差金によるものである。					
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
	阿嘉地区観光道路整備工事 整備延長L=350m		目標	工事実施			
			実績	工事完了			
			目標				
		実績					
達成状況説明	環境省と国立公園事業執行協議書に伴う自然公園法第10条第2項の規定に基づく許可手続きにあたり、調整に不測の日数を要し、3年度中での事業完了が困難となった為、4年度へ繰越し、令和5年2月10日に整備完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R3年度	R4年度	R5年度	目標値(R5年度)
			目標	() (工事実施)	()	()	()
	阿嘉地区観光道路整備工事 整備延長L=350m		実績	工事実施			
	【R5成果目標】 阿嘉島観光客の10%以上が本道路を利用することを目標とし、アンケートにより把握する。		目標	() ()	()	()	(10%以上の利用)
			実績				
進捗状況説明	山林観光道路を整備することにより、遊泳が出来ない冬のオフシーズンでも、住民、観光客が楽しめる観光メニューの開発ができた。						


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> ・観光道路の整備に伴い、観光客の増加が見込まれるが、ゴミの問題や、電話のアンテナが圏外となるため、緊急時の対応が懸念される。 ・台風等による船舶の欠航による資材運搬の遅れの発生。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ゴミを持ち込まない(持ち帰る)等の看板設置が必須であり、緊急時の対応も必須。 ・資材運搬についての予約等村が協力を行う。

今後の取り組み方針

観光道路を利用する方へ注意事項などを作成し、観光客への周知を事業者(民宿等)へ協力してもらおう。
また観光道路までの案内板の作成を検討する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
35,090	35,090	28,072	7,018	0

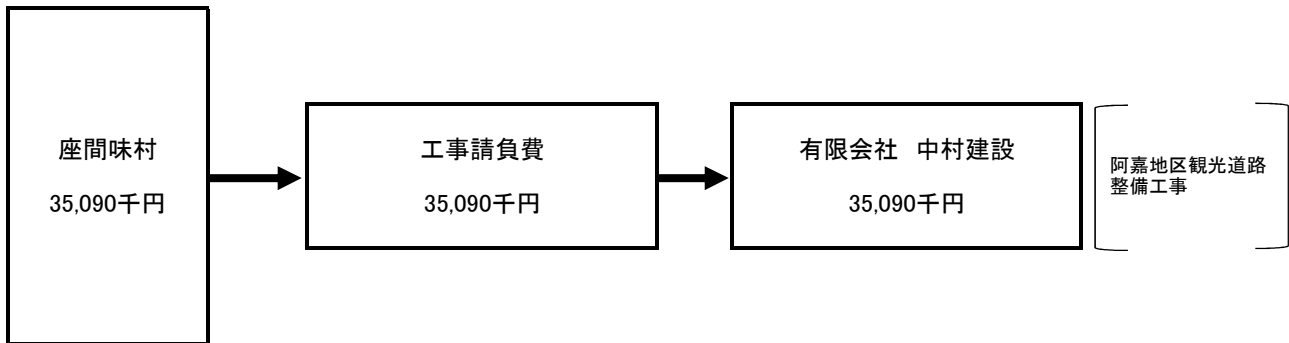

資金の用途の点検・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	○業者選考については指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○不用額は、入札残である為、適正であると判断した。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	○費目・用途については、精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	

市町村名		座間味村					
令和3年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】							
事業番号・事業名	1-⑤	座間味村ウェルカムパーク整備事業			沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(2)-エ	
担当部署名	産業振興課	事業実施(予定)年度	令和3~令和4年度		沖縄振興基本方針該当箇所	観光客の受入体制の整備	
事業内容	座間味港背後地において、環境省が整備する慶良間諸島国立公園座間味博物展示施設と連携して、観光客や村民が憩い、交流できる場を創出するため、公園やトイレ・シャワー施設の整備を行い、国立公園にふさわしいゲート空間、交流施設「ウェルカム・パーク」を整備する						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和5年度以降)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input checked="" type="checkbox"/> その他(請負工事)						
予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース)	予算の状況	R1年度	R2年度	R3年度	R3年度(繰越)	R4年度	
		(a)当初予算額	30,670	3,520	49,467	0	
	(b)予算現額	23,600	3,520	49,467	0		
	(c)増減額(b-a)	▲7,070	0	0	0		
	(d)繰越額	0	0	0	49,467		
	A.計(b+d)	23,600	3,520	49,467	49,467		
	B.執行済額	21,862	3,410	0	47,884		
	うち交付金充当額	17,489	2,728	0	38,307		
	次年度繰越額	0	0	49,467	0		
	執行率(%) (B/A)	92.6%	96.9%	0.0%	96.8%		
予算の状況の説明	予算額としては現場技術委託業務が2,673千円、施設整備工事が46,793千円であり、不用額1,582円については入札差金によるものである。						
活動目標(指標)及び達成状況	R3活動目標(指標)		達成状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	座間味村ウェルカムパーク実施設計	目標	解体設計・工事実施	実施設計			
		実績	解体設計・工事完了	実施設計完了			
	公園・トイレ・シャワー施設の整備及び現場技術委託	目標			工事実施	工事実施	
		実績			工事完了	工事完了	
達成状況説明	令和3年度に2回入札を行ったが不調になった為、設計内容の見直しを行い4年度へ繰越し、令和5年2月28日に整備完了した。						
成果目標(指標)及び進捗状況	R3成果目標(指標)		基準値(年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R5年度)
	座間味村ウェルカムパーク実施設計	目標	()	(実施設計)	()	()	()
		実績		実施設計完了			
	公園・トイレ・シャワー施設の整備及び現場技術委託	目標	()	()	(工事実施)	()	()
		実績			工事実施		
	【R5成果目標】 憩い、交流の場として活用出来たか(80%)を含め公園利用者へのアンケートにより、本事業のあり方を検証する。	目標	()	()	()	()	(80%以上)
実績							
進捗状況説明	夏のトップシーズンへ向け、住民、観光客が快適に利用できる玄関口として、国立公園にふさわしいゲート空間ができた。						


取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	<ul style="list-style-type: none"> ・下請業者の離島単価高騰に伴い、離島工事の受注を控える業者が多い事から入札不調・不落が危惧される。 ・台風等による船舶の欠航による資材運搬の遅れの発生。 	<ul style="list-style-type: none"> ・村で空き家の紹介、村施設の提供等の協力を行う。 ・資材運搬についての予約等村が協力を行う。

今後の取り組み方針

住民や関係機関等との意見交換を行いながら、改善等が発生したら、速やかに対処し、受け入れ態勢の質の向上に努める。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	交付金		交付対象外経費
		充当額	市町村負担金	
47,884	47,884	38,307	9,577	0

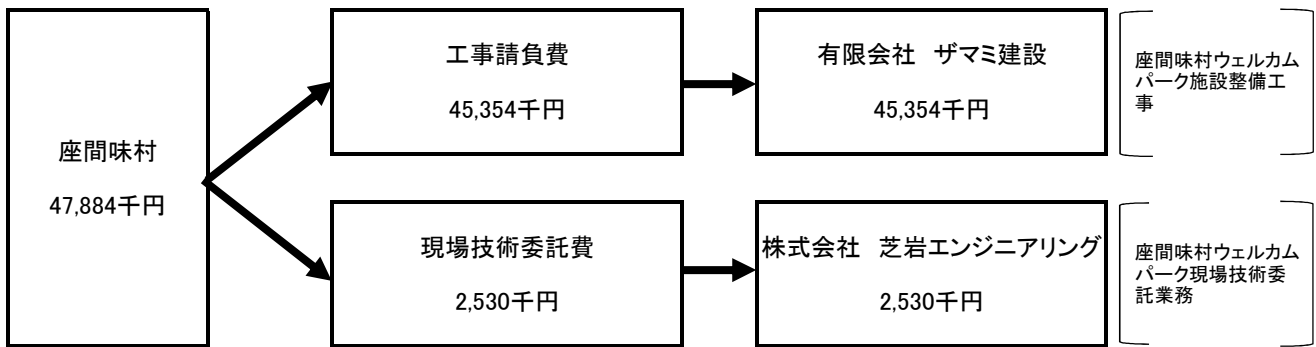

資金の用途の点検・評価	評価	点検項目	評価に関する説明
	○	支出先の選定方法は妥当か。	<ul style="list-style-type: none"> ○業者選考については指名競争入札で選定しており、妥当であったと考えている。 ○不用額は、入札残である為、適正であると判断した。 ○費目・用途については、精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	
