

【H23.11.04 版】

**県立特別支援学校 編成整備実施計画**  
(平成24年度～平成33年度)

**【 素 案 】**

## 【 目 次 】

### 第4章 目標達成に向けた実施計画

---

施策1：小中学校への分校・分教室の設置	3
施策2：軽度知的障害に対応する高等部の設置拡充	4
施策3：より身近な地域で就学できる特別支援学校の整備	6
施策4：看護師配置の拠点化と学校運営体制の見直し	7
施策5：泡瀬特別支援学校の分校設置	9
施策6：スクールバスの運営方法の見直し	10
施策7：個別施設整備計画の作成	11

### 関係資料


---

計画の進行管理について	12
実施計画予定表	13
目標（第3章）と施策（第4章）の対応表	14

※ この「編成整備実施計画」は、「編成整備の基本方向」（第1章～第3章）の続編なので、第4章から始めています。なお、「編成整備の基本方向」と「編成整備実施計画」をあわせて、「編成整備計画」となります。

## 第4章 目標達成に向けた実施計画

- ・この章では、前章で設定した目標を達成するため必要となる具体的な「手段」と「行程」を、「実施計画」として策定します。
- ・実施計画は、7つの「施策」から構成されます。施策は、複数の「計画」から構成されます。
- ・前章で設定された各目標に一つの計画が対応するわけではなく、一つの計画により複数目標の達成を目指すこともあります。また、その逆の場合もあります。

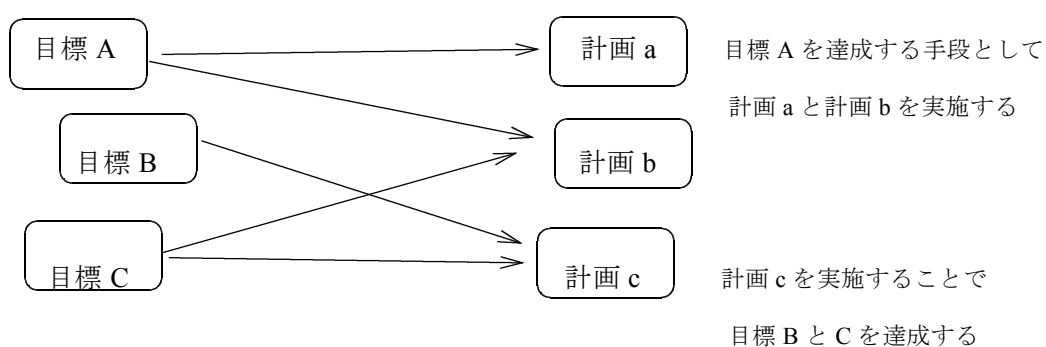

- ・また、実施計画を策定するにあたっては、設定した目標達成年度における特別支援学校の状況を踏える必要があります。達成年度における目標と課題状況の差が、実施計画で対応すべき内容になります（次ページ表参照）。

○ 県立特別支援学校編成整備計画 目標予定表【計画期間：平成24年度～平成33年度】

＜記述の説明＞  
 設定目標 → 280 ↓  
 現状・推計 → 推計 270

目標項目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	実施計画で対応が必要となる事柄
1 美咲特別支援学校本校	推計 340	推計 344	推計 352	推計 359	280人 ↓ 推計 270*	推計 282	推計 293	推計 304	推計 313	245人 ↓ 推計 323	H33までに78人分の受け皿が必要
2 大平特別支援学校本校	推計 314	推計 318	推計 326	推計 332	280人 ↓ 推計 343	推計 354	推計 365	推計 375	推計 384	245人 ↓ 推計 393	H28までに63人分、H33までに148人分の受け皿が必要
名護特別支援学校本校	200人 ↓ 推計 124	200人 ↓ 推計 126	200人 ↓ 推計 129	200人 ↓ 推計 131	200人 ↓ 推計 135	200人 ↓ 推計 139	200人 ↓ 推計 144	200人 ↓ 推計 147	200人 ↓ 推計 151	200人 ↓ 推計 155	
1 3 島尻特別支援学校本校	200人 ↓ 推計 169	200人 ↓ 推計 171	200人 ↓ 推計 175	200人 ↓ 推計 179	200人 ↓ 推計 185	200人 ↓ 推計 191	200人 ↓ 推計 196	200人 ↓ 推計 202	200人 ↓ 推計 206	200人 ↓ 推計 211	H31までに2人分、H33までに11人分の受け皿が必要
西崎特別支援学校本校	200人 ↓ 推計 174	200人 ↓ 推計 176	200人 ↓ 推計 180	200人 ↓ 推計 184	200人 ↓ 推計 190	200人 ↓ 推計 196	200人 ↓ 推計 201	200人 ↓ 推計 207	200人 ↓ 推計 212	200人 ↓ 推計 217	H30までに1人分、H33までに17人分の受け皿が必要
4 医療機関等隣接特別支援学校の運営形態見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	見直し	計画期間中、動向を注視しながらの対策検討が必要
5 鏡が丘浦添分校+浦添分教室	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	10人 ↑	
6 泡瀬特別支援学校	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	175人 ↓	
2 1 軽度知的障害高等部（現定数195）	現定数 195	現定数 195	現定数 195	現定数 195	300 ↑ 現定数 195	300 ↑ 現定数 195	300 ↑ 現定数 195	300 ↑ 現定数 195	300 ↑ 現定数 195	300 ↑ 現定数 195	平成28までに105人分の受け皿が必要
3 1 肢体不自由・病弱本島看護師拠点校					拠点集約						H28までに集約が必要
4 1 小・中・高等学校への分校・分教室										小中高に整備	H33までに整備が必要
1 視覚障害対応の特別支援学校（北部・中部）					整備						H28までに整備が必要
2 聴覚障害対応の特別支援学校（北部・南部）					整備						H28までに整備が必要
5 3 専門性の確保	確保	確保	確保	確保	確保	確保	確保	確保	確保	確保	計画期間中、動向を注視しながらの対策検討が必要
4 スクールバス（分教室、共同運行）					1H20 ↓						H28までに1H20以内とする必要
1 全面改築計画（鏡が丘・鏡が丘浦添分校）					策定						
6 2 一部改築計画（泡瀬特支、那覇特支）					策定						H28までに策定が必要

\* 美咲特別支援学校分校（定員100人）は平成26年度に開校予定だが、定員は段階的に達すると想定しているため、平成28年度の推計人数から100を引いている。

## 施策 1：小中学校への分校・分教室の設置

- ・施策 1 は、特別支援学校の分校・分教室を市町村立小中学校へ設置していく計画から構成されます。これらの計画は、共生社会の実現に向けた交流及び共同学習の推進や、より身近な地域での就学を達成するために重要であり、また過密を解消するためにも必要です。
- ・交流及び共同学習は、小中学校の児童生徒への教育的効果のほか、障害を持った児童生徒の居住地域とのつながりが強まるなど、市町村にとっても利点のある施策と考えています。

### <計画>

- (1) 平成 24 年度に分校・分教室設置要綱を作成し、協定を結ぶ市町村教育委員会の募集を始める。
- (2) 平成 25 年度に県教委は、設置要綱に基づいて募集に応じた市町村教委と協定を交わし、既存施設の有効活用を図りながら設置準備を進める。
- (3) 平成 26 年度より、市町村立学校に特別支援学校の分校・分教室を設置する。
- (4) 平成 33 年度までに、市町村立学校に合計で 180 人定員以上の特別支援学校の分校・分教室を設置する。

### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
要綱作成・募集	協定・設置準備	設置	〃	〃	〃	〃	〃	〃	180人以上定員設置

### <対応する目標>

- 1-(1) 美咲特別支援学校本校の在学者数を平成 28 年度までに 280 人以内とし、更に、平成 33 年度までに 245 人以内とする。
- 1-(2) 大平特別支援学校本校の在学者数を平成 28 年度までに 280 人以内とし、更に、平成 33 年度までに 245 人以内とする。
- 1-(3) 名護特別支援学校、島尻特別支援学校、西崎特別支援学校の各本校の在学者数が、計画期間内に 200 人を超えることがないようにする。
- 4-(1) 平成 33 年度までに、児童生徒が小・中・高校のいずれかの段階で、小・中・高校の学校内に設置された特別支援学校の分校・分教室においても交流及び共同学習を行える環境を整備する。
- 5-(4) 平成 28 年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を 1 時間 20 分以内にする。

## 施策 2：軽度知的障害に対応する高等部の設置拡充

- ・施策 2 は、特別支援学校の軽度知的障害高等部の設置を拡充していく計画から構成されます。これらの計画はニーズの高い軽度知的障害高等部の定数を増やすだけでなく、交流及び共同学習の推進や、より身近な地域での就学を達成するためにも重要になります。

### <計画>

- (1) 平成 24 年度より準備を始め、平成 25 年度に那覇特別支援学校に軽度知的障害高等部部門を設置する（3 学年 30 人定員）。この高等部部門には、那覇特別支援学校の周辺環境（県立看護大学や医療機関の立地）や近年の雇用情勢を考慮し、福祉関連コースを設ける。
- (2) 高等学校に特別支援学校軽度知的障害高等部の分校・分教室を設置するにあたり、平成 25 年度に調査研究モデル事業の検証結果を参考にして設置高等学校を選定する。
- (3) 設置前年度より、専門性確保に必要な人的配置体制の構築及び施設設備の整備等の準備を始める。
- (4) 平成 27 年度に、宮古地区の高等学校に宮古特別支援学校の分教室（3 学年 30 人定員、軽度知的障害高等部）を設置する。
- (5) 平成 27 年度に、八重山地区の高等学校に、八重山特別支援学校の分教室（3 学年 30 人定員、軽度知的障害高等部）を設置する。
- (6) 平成 27 年度に、北部地区の高等学校に、名護特別支援学校の分教室（3 学年 30 人定員、軽度知的障害高等部）を設置する。
- (7) 平成 28 年度に、那覇南部地区の高等学校に、大平特別支援学校の分校（3 学年 60 人定員、軽度知的障害高等部）を設置する。

### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
那覇特支 設置準備	那覇特支 部門設置								
	設置高校 の選定	設置準備	3地区分 教室設置	那覇南部 地区設置					

### <対応する目標>

- 1-(1) 美咲特別支援学校本校の在学者数を平成 28 年度までに 280 人以内とし、更に、平成 33 年度まで

に 245 人以内とする。

1-(2) 大平特別支援学校本校の在学者数を平成 28 年度までに 280 人以内とし、更に、平成 33 年度までに 245 人以内とする。

1-(3) 名護特別支援学校、島尻特別支援学校、西崎特別支援学校の各本校の在学者数が、計画期間内に 200 人を超えることがないようにする。

2-(1) 平成 28 年度までに、軽度知的障害生徒が職業的・社会的自立を目指す特別支援学校高等部の在学者数を 300 人にし、計画期間内に 300 人以下にならないようにする。

4-(1) 平成 33 年度までに、児童生徒が小・中・高校のいずれかの段階で、小・中・高校の学校内に設置された特別支援学校の分校・分教室においても交流及び共同学習を行える環境を整備する。

5-(4) 平成 28 年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を 1 時間 20 分以内にする。

### 施策3：より身近な地域で就学できる特別支援学校の整備

- ・施策3は、より身近な地域で就学できる特別支援学校を整備していく計画から構成されます。この計画は、通学における在学者と保護者の負担を軽減させるだけでなく、学校を卒業した後の地域との繋がりを築いていくためにも重要になります。

#### <計画>

- (1) 平成 25 年度に、教育の専門性や集団性を確保しながらより身近な地域で就学できる体制を整備するために次のいずれの方法がより適当であるか、検討作業を始める。
  - ・複数障害種に対応する特別支援学校の整備
  - ・特別支援学校の分校・分教室の整備
  - ・教諭が現地に赴くサテライト教室の整備
  - ・市町村教育委員会が実施する通級指導体制への支援充実
  - ・市町村教育委員会が設置する特別支援学級への支援充実
- (2) 平成 26 年度に、専門性確保に必要な人的配置体制の構築及び施設設備の整備を始める。
- (3) 平成 28 年度に、本島北部地区に視覚障害及び聴覚障害に対応できる体制を整備する。
- (4) 平成 28 年度に、本島中部地区に視覚障害に対応できる体制を整備する。
- (5) 平成 28 年度に、本島南部地区に聴覚障害に対応できる体制を整備する。

#### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
	検討作業	整備等の準備	〃	体制整備					

#### <対応する目標>

- 5-(1) 視覚障害に対応する学校を、本島北部及び中部地域に平成 28 年度までに整備する。
- 5-(2) 聴覚障害に対応する学校を、本島北部及び南部地域に平成 28 年度までに整備する。
- 5-(3) 視覚障害又は聴覚障害に対応する学校の新たな整備にあたっては、障害に応じた教育の専門性が確保されるようにする。
- 5-(4) 平成 28 年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を 1 時間 20 分以内にする。



#### 施策 4：看護師配置の拠点化と学校運営体制の見直し

---

- ・施策 4 は、沖縄本島内における看護師配置の拠点化と、学校規模に応じた運営体制の見直しに関する計画から構成されます。この計画は、看護師の効率的・効果的な配置だけでなく、学校規模の適正化を図る上でも重要です。

##### <計画>

- (1) 肢体不自由、病弱又は肢体不自由及び病弱の両障害種に対応する特別支援学校における平成 28 年度の沖縄本島内の看護師配置拠点校は、学校規模、施設設備の状況を勘案して、以下の通りとする。
  - ① 国頭地区：桜野特別支援学校
  - ② 中頭地区：泡瀬特別支援学校
  - ③ 那覇地区：鏡が丘特別支援学校
  - ④ 島尻地区：島尻特別支援学校
- (2) 森川特別支援学校は、隣接する沖縄病院の改築計画や鏡が丘特別支援学校の病弱受け入れ状況を踏まえ、平成 27 年度末で休校とする。
- (3) (2) の実施にあたり平成 24 年度に準備を始め、平成 25 年度から森川特別支援学校の通学生の新たな受け入れを停止し、平成 27 年度までに森川特別支援学校に通学する児童生徒は鏡が丘特別支援学校へ転学することとする。この時、鏡が丘特別支援学校における病弱教育及び病院内訪問学級教育の専門性確保に必要な人的配置体制の構築及び施設設備の整備をあわせて実施する。
- (4) 鏡が丘特別支援学校に、平成 28 年度までに病弱教育及び病院内訪問学級教育の専門性確保のため病弱部門を置く。また、病弱部門の教室設置等の必要となる施設設備の整備を実施する。
- (5) 鏡が丘特別支援学校浦添分校（浦添分教室を含む）の児童生徒数を前々年度から把握することとし、10 人を下回ることが推計されたときは、対応策を準備する。

<計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
				看護師 拠点化					
整備等 準備	通学生停止 転学	転学	転学 年度末休校						
鏡分校 数の把握	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

<対応する目標>

- 1-(4) 医療機関等に隣接し主にその入所者を受け入れる特別支援学校においては、隣接施設からの通学者の見通し等を踏まえ、運営形態を本校、分校又は休校とする。
- 1-(5) 鏡が丘特別支援学校浦添分校の在学者数が、鏡が丘特別支援学校高等部分教室とあわせて、計画期間内に10人を下回ることがないようにする。
- 3-(1) 肢体不自由、病弱又は肢体不自由及び病弱の両障害種に対応する特別支援学校においては、平成28年度までに、看護師配置校を本島各地区（国頭・中頭・那覇・島尻）ごとの拠点校に集約する。

## 施策 5：泡瀬特別支援学校の分校設置

---

- ・施策 5 は、泡瀬特別支援学校の分校設置に関する計画から構成されます。この計画は、より身近な地域での就学を達成するために重要であり、また過密を解消するためにも必要です。

### <計画>

- (1) 平成 24 年度に泡瀬特別支援学校の分校設置に向けた準備を進める。この時、特に小児発達センターや近隣病院との連携体制の構築する。
- (2) 平成 27 年度までに、泡瀬特別支援学校の分校を設置する。
- (3) 泡瀬特別支援学校の分校を設置するにあたっては、施策 4 の計画(1)に関わらず、必要に応じて看護師を配置する。

### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
設置準備	設置準備	設置準備	分校設置						

### <対応する目標>

- 1-(6) 泡瀬特別支援学校の在学者数を、計画期間内は 175 人以内とする。
- 5-(4) 平成 28 年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を 1 時間 20 分以内にする。

## 施策6：スクールバスの運営方法の見直し

---

- ・施策6は、特別支援学校のスクールバスの運営方法を見直す計画から構成されます。この計画は、目標5-(4)を達成するための手段となります。

### <計画>

- (1) 平成25年度に、スクールバスの運営方法のあり方を見直すにあたり、次の事項を踏まえながら、平成28年度以降のスクールバス運営方法のあり方を決める。
  - ・当編成整備計画の施策(1)～(5)の進展状況
  - ・各校における運転業務の委託状況
  - ・各校における登校と下校のスクールバス利用状況
  - ・他県のスクールバスの運営方法（共同運行等）
  - ・その他スクールバス運営に関連する事項
- (2) 平成26年度に、スクールバス運営方法のあり方に基づいた準備を進め、平成28年度に見直した運営方法を実施する。

### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
	運営あり方	準備	〃	実施					

### <対応する目標>

- 5-(4) 平成28年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を1時間20分以内にする。

## 施策 7：個別施設整備計画の作成

---

- ・施策 7 は、特別支援学校の個別施設整備計画を作成する項目から構成されます。この計画は、目標 6-(1)、6-(2) を達成するための手段となります。

### <計画>

- (1) 平成 27 年度に、対象学校へのヒアリング及び実地調査を実施し、整備の必要性を判断する。
- (2) 平成 28 年度に、整備が必要と判断した学校の整備計画を策定する。

### <計画スケジュール表>

H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
			必要性 の判断	計画策定					

### <対応する目標>

- 6-(1) 編成整備計画の部分計画として、平成 33 年度にはほぼ全ての施設が築 35 年以上となる鏡が丘特別支援学校及び鏡が丘特別支援学校浦添分校に関する全面改築計画を、平成 28 年度までに策定する。
- 6-(2) 編成整備計画の部分計画として、平成 33 年度に一部施設が築 35 年以上となる泡瀬特別支援学校、那覇特別支援学校及び森川特別支援学校に関する一部改築計画を、平成 28 年度までに策定する。

## 計画の進行管理について

---

- ・施策1～7の実施にあたっては、複数部署が連携しながら進めていく必要があることから、計画の進行管理が重要になります。
- ・計画の進行管理を適切に行うため、教育管理統括監が主宰して教育庁各課長が参加する会議を年2回程度開催します。
- ・また、この会議の下に教育企画監が主催して教育庁各課班長が参加する幹事会を置き、年4回程度開催し、計画の進行管理にあたります。

○ 県立特別支援学校編成整備計画 実施計画予定表【計画期間：平成24年度～平成33年度】

	実施計画項目	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
1	小中学校への分校・分教室の設置	要綱作成・募集	協定・設置準備	設置	〃	〃	〃	〃	〃	〃	180人以上 定員設置
2	軽度知的障害高等部の設置拡充 (那覇特別支援学校)	那覇特支 設置準備	那覇特支 部門設置								
	軽度知的障害高等部の設置拡充 (高等学校への設置)		設置高校 の選定	設置準備	3地区分 教室設置	那覇南部 地区設置					
3	より身近な地域で就学できる 特別支援学校の整備		検討作業	整備等の 準備	〃	体制整備					
4	看護師配置の拠点化					看護師 拠点化					
	森川特別支援学校の休校	整備等 準備	通学生停止 転学	転学	転学 年度未休校						
5	鏡が丘特別支援学校 浦添分校の規模の確保	鏡分校 数の把握	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
	泡瀬特別支援学校の 分校設置	設置準備	設置準備	設置準備	分校設置						
6	スクーリングの運営方法の見直し		運営 あり方	準備	〃	実施					
7	個別施設整備計画の作成				必要性 の判断	計画策定					

目標(第3章)と施策(第4章)の対応表

項目	目標	施策
美咲特別支援学校本校の在学者数を平成28年度までに280人以内とし、更に、平成33年度までに245人以内とする。	1-(1)	1 小中学校への分校・分教室の設置 ・市町立学校への特別支援学校の分校・分教室設置
大平特別支援学校本校の在学者数を平成28年度までに280人以内とし、更に、平成33年度までに245人以内とする。	1-(2)	
名護特別支援学校、島尻特別支援学校、西崎特別支援学校の各本校の在学者数が、計画期間内に200人を超えることがないようにする。	1-(3)	2 軽度知的障害に対応する高等部の設置拡充 ・那覇特別支援学校への軽度知的障害部門の設置 ・県内各地区高等学校の特別支援学校の分校・分教室設置
医療機関等に隣接し主にその入所者を受け入れる特別支援学校においては、隣接施設からの通学者の見直し等を踏まえ、運営形態を本校、分校又は休校とする。	1-(4)	
鏡が丘特別支援学校浦添分校の在学者数が、鏡が丘特別支援学校高等部分教室とあわせて、計画期間内に10人を下回ることがないようにする。	1-(5)	3 より身近な地域に就学できる特別支援学校の整備 ・本島各地区への視覚障害及び聴覚障害対応体制の整備
泡瀬特別支援学校の在学者数を、計画期間内は175人以内とする。	1-(6)	
平成28年度までに、軽度知的障害生徒が職業的・社会的自立を目指す特別支援学校高等部の在学者数を300人にし、計画期間内に300人以下にならないようにする。	2-(1)	4 看護師配置の拠点化と学校運営体制の見直し ・本島内看護師配置の拠点化 ・森川特別支援学校の廃校 ・鏡が丘特別支援学校浦添分校の対応策準備体制
肢体不自由、病弱又は肢体不自由及び病弱の障害者種に対応する特別支援学校においては、平成28年度までに、看護師配置校を本島各地区(国頭・中頭・那覇・高沢)ごとの拠点校に集約する。	3-(1)	
平成33年度までに、児童生徒が「中・高校の学びの段階で、小・中・高校の学校内に設置された特別支援学校の分校・分教室において交流及び共同学習を行える環境を整備する(なお、目標達成に向けては沖縄県立特別支援学校高等部分教室の調査研究モデル事業1(平成22年度～平成24年度)の検証結果を十分に踏まえる)	4-(1)	5 泡瀬特別支援学校の分校設置
視覚障害に対応する学校を、本島北部及び中部地域に平成28年度までに整備する。	5-(1)	
聴覚障害に対応する学校を、本島北部及び南部地域に平成28年度までに整備する。	5-(2)	6 スクールバスの運営体制の見直し
視覚障害又は聴覚障害に対応する学校の新たな整備にあたっては、障害に応じた教育の専門性が確保されるようにする。	5-(3)	
平成28年度までに、特別支援学校のスクールバスの朝の運行時間を1時間20分以内にする。	5-(4)	7 個別施設整備計画の作成
編成整備計画の部分計画として、平成33年度にはほぼ全ての施設が築35年以上となる鏡が丘特別支援学校及び鏡が丘特別支援学校浦添分校に関する全面改築計画を、平成28年度までに策定する	6-(1)	
編成整備計画の部分計画として、平成33年度に一部施設が築35年以上となる泡瀬特別支援学校、那覇特別支援学校及び森川特別支援学校に関する一部改築計画を、平成28年度までに策定する	6-(2)	-
手段設定に向けては、費用対効果を選択基準とする	7-(1)	
