

令和3年度 第4回  
首里城公園管理体制構築検討委員会

【資料2】 首里城公園管理体制構築計画

## 首里城公園管理体制構築計画の検討経緯及び今後の予定

### (これまでの検討経緯)

令和3年7月26日：第1回首里城公園管理体制構築検討委員会

○首里城公園管理体制構築計画の検討の進め方の確認

(令和3年度の検討事項、検討の進め方など)

令和3年11月10日：第2回首里城公園管理体制構築検討委員会

○首里城公園管理体制構築計画の策定方針の確認

(計画の位置づけ、取組の方向性、計画期間の考え方、県民等意見対応に関する対応方針等)

○首里城公園管理体制構築計画の内容の検討

令和4年1月31日：第3回首里城公園管理体制構築検討委員会

○首里城公園管理体制構築計画の構成、取組方針、主な取組の確認

○首里城公園管理体制構築計画の内容の検討

令和4年2月16日～3月1日：県民等意見募集

○首里城公園管理体制構築計画(案)に対する意見募集

ご意見の数：20件(3人・団体)

令和4年3月17日：第4回首里城公園管理体制構築検討委員会

○首里城公園管理体制構築計画のとりまとめ

=====

### (今後の予定)

令和4年3月または4月(予定)


○首里城公園管理体制構築計画の策定

## ・計画策定の趣旨

沖縄県は、首里城正殿等を含む首里城公園内の施設について、二度と火災による焼失を生じさせないように、国の首里城正殿等の復元に向けた取組と連携し、首里城公園の管理体制の構築に取り組んでいます。令和3年度には、「首里城公園管理体制構築検討委員会」を設置し、国と連携して、首里城公園の管理体制の構築に関する議論を進めてきたところです。これらの議論を踏まえ、今後の首里城公園の管理体制の構築に向けた具体的な取組の方向性や目標時期等を明らかにした「首里城公園管理体制構築計画」を策定するものです。

## ・位置づけ

首里城復興基本計画の基本施策2「火災の原因究明及び防火設備・施設管理体制の強化」に関する個別の実施計画であり、「首里城火災に関する再発防止策等報告書」の提言を踏まえ、沖縄県が策定した「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」の具体的な行動計画。

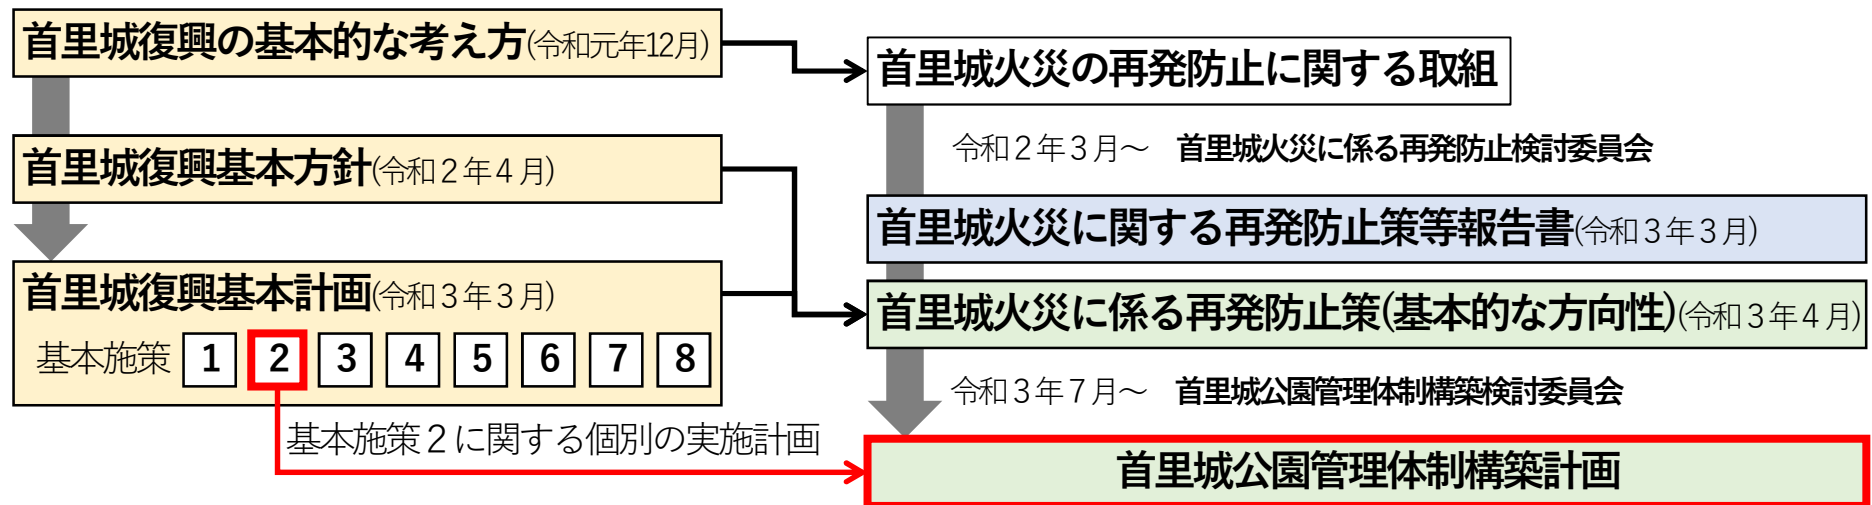

## ・計画期間

令和3年度～令和13年度（首里城復興基本計画の期間内）

## ・計画期間の考え方

令和3年度から正殿完成までを「首里城公園に適した管理運営に向けた準備・移行期間」とし、正殿の工事等の進捗にあわせた管理運営を行いながら、令和8年の正殿完成時には首里城公園に適した管理運営の実施ができるよう取り組むこととする。正殿完成以降は、正殿の管理運営を行いながら、管理運営の内容等の継続的な改善や定期的な見直しを行うこととする。

また、正殿完成後に整備予定の北殿・南殿等の管理運営に関する検討については、国が実施する復元検討とあわせて検討を行うこととする。

### 首里城公園管理体制構築計画の計画期間の考え方


年度	R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)～R13(2031)
計画期間の考え方	首里城公園に適した管理運営に向けた準備・移行期間					首里城公園に適した管理運営	
管理体制の構築を目指す時点		正殿工事期間中の管理運営 （城郭内）				正殿単体完成時の管理運営	
		木材倉庫完成予定	素屋根完成予定			正殿完成予定	
管理期間(案)	現在の管理期間 ～R5.1.31	次期・管理期間 R5.2.1(県営R5.4.1)～R8.3.31(想定)			次々期・管理期間 R8.4.1～R13.3.31(想定)		

## ・計画の対象範囲の考え方

令和3年度は、正殿の復元の検討とあわせて、正殿の防災・防火対策を重点的に具体的な検討を行ってきたことから、本計画は、**正殿の防災・防火対策を中心とした内容**であり、**首里城火災に関係のあったエリアを中心とした範囲を計画対象**としている。



首里城公園管理体制構築計画(令和3年度検討)の対象範囲

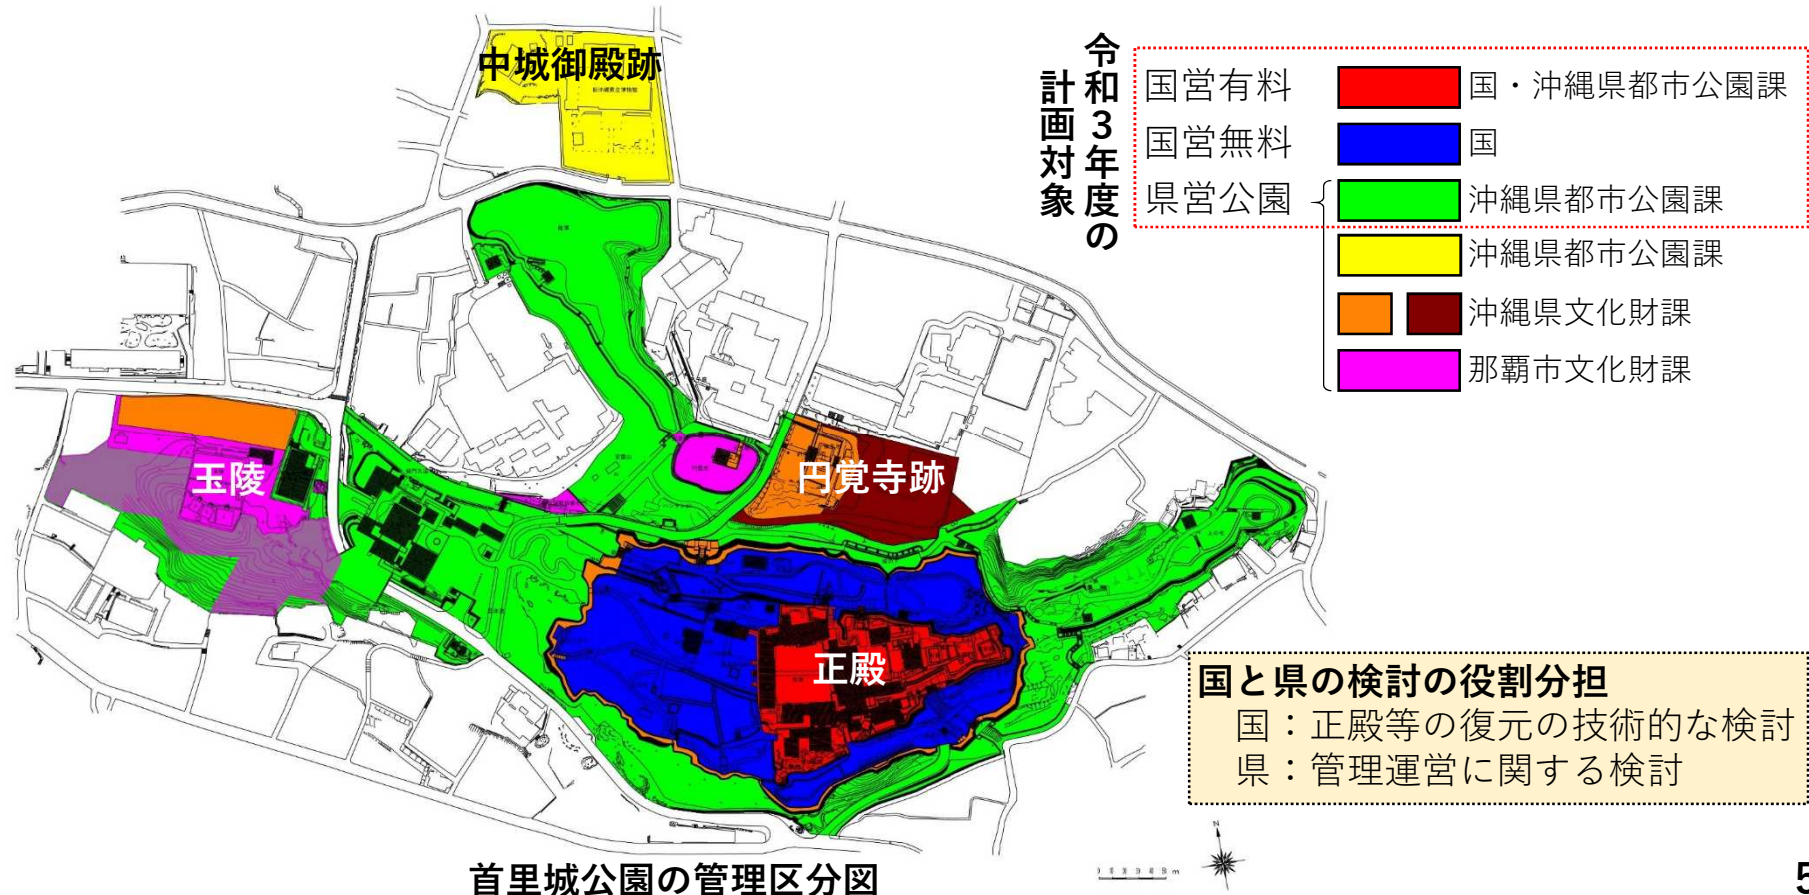

首里城公園の管理区分図

## ・首里城公園の管理体制構築に向けた取組方針（案）

「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」（令和3年4月23日策定）の3つの柱に基づき、首里城公園の管理体制の構築に向けた取組方針を以下のとおり、整理した。

### 首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）※令和3年4月23日策定

#### ① 防災センター機能の再編

##### 取組方針① 防災センター機能の強化

- ①-1 防災センター機能の役割分担
- ①-2 公園管理センターの機能強化
- ①-3 県営公園の防災センター機能の強化
- ①-4 情報共有手段の強化

#### ② 防災・防火設備等の運用体制の強化

##### 取組方針② 城郭内における初動対応の強化

- ②-1 奉神門の体制強化
- ②-2 正殿等の主要施設の体制強化
- ②-3 初動対応に係る人材確保及び人材育成

##### 取組方針③ 様々な公園利用者に配慮した避難誘導體制の再構築

- ③-1 安全な避難誘導體制の確保
- ③-2 災害情報の伝達方法の見直し

#### ③ 管理運営に関する制度の活用方法の見直し

##### 取組方針④ 首里城公園に適した管理運営の確立

- ④-1 防火管理の適切な実行体制の確保
- ④-2 防災・防火対策の具体的な対応等の明確化
- ④-3 継続的な改善に向けた新たな仕組みの導入

首里城公園の管理体制の構築

正殿工事等に伴う首里城公園内の状況の変化に応じた管理体制の構築が求められることから、本計画における管理体制の構築を目指す時点を以下の4つの時点とした。なお、正殿単体完成時から城郭内全体完成時までは、北殿・南殿等の復元検討とあわせて、取組の目標時点を検討する。

## < 首里城公園の管理体制の構築を目指す時点（取組の目標時点） >

木材倉庫  
・原寸場  
完成時

素屋根  
完成時

正殿単体  
完成時


城郭内全体  
完成時

R4


R5

R8


北殿・南殿等の復元検討とあわせて、  
取組の目標時点を検討する。

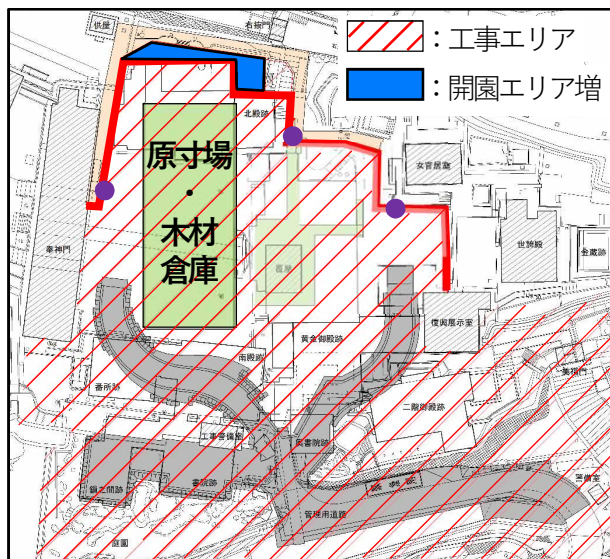

木材倉庫・原寸場 完成 (R4)  
(原寸場廻り見学デッキの管理運営の開始)

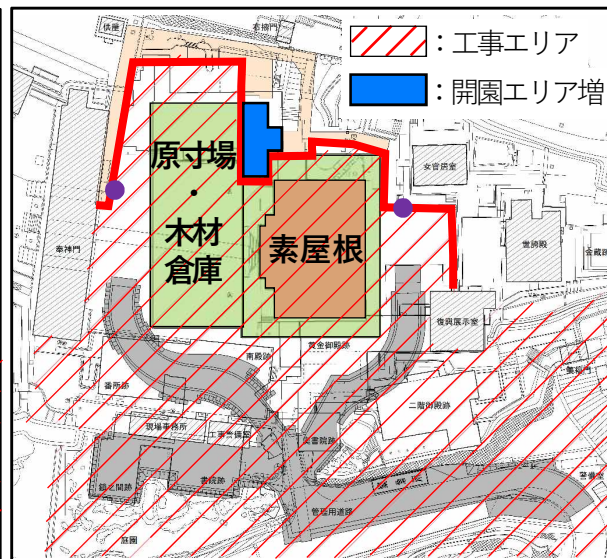

素屋根 完成 (R5)  
(見学エリアの管理運営の開始)

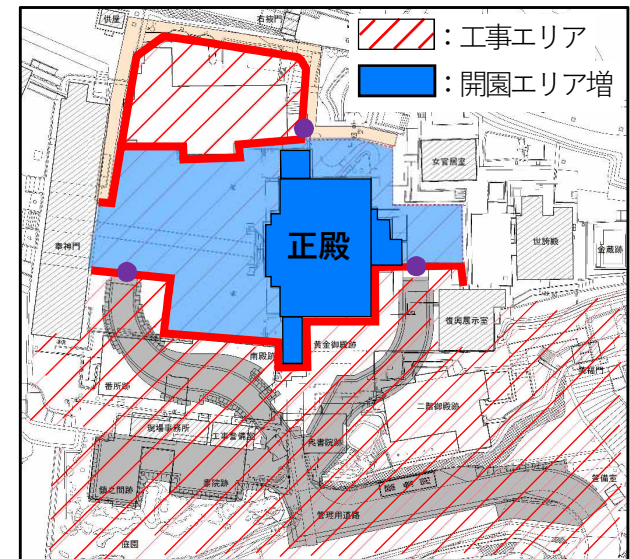


正殿単体完成時 (R8)  
(正殿の管理運営の開始)

# 首里城公園管理体制構築計画の工程の考え方（案）

【第4回委員会時点（案）】

「計画期間の考え方」、「取組の目標時点」、「取組方針に基づく具体的な取組(取組の概略)」、「管理運営に関する手続き等」の関係性は、以下のとおりである。

取組の目標時点▼に向けて、取組を進め、管理運営に関する手続等にも反映させるものとする。

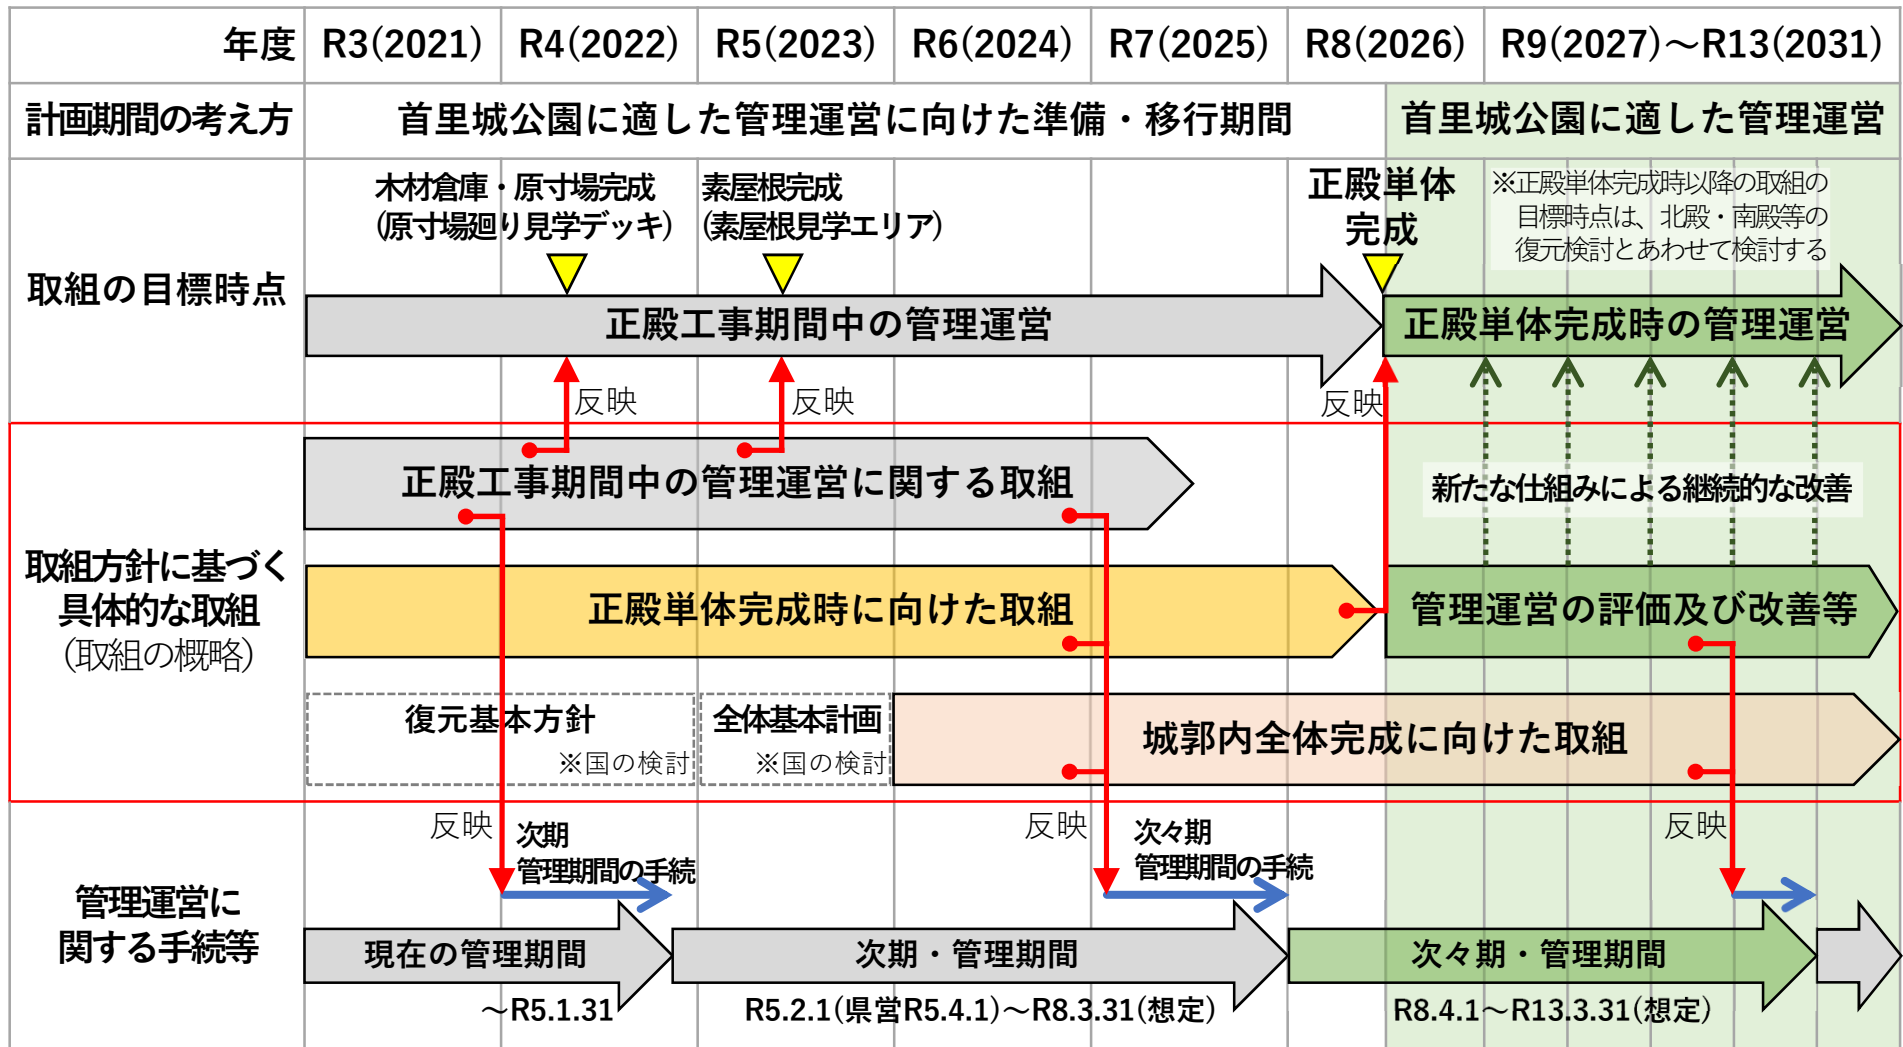



# 首里城公園管理体制構築計画の工程の考え方（案）

【第4回委員会時点（案）】

工事等に関する取組の工程の考え方は以下のとおりである。

	R3(2021)	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	
<b>防火設備等の運用体制</b> 避難誘導の検討		▼	▼				
	防災センター機能の役割分担等	正殿工事期間中の初動対応（初期消火・避難誘導等）の詳細検討 正殿単体完成時の初動対応（初期消火・避難誘導等）の詳細検討					▼
<b>防火設備等の整備</b> 火災受信機 監視モニター 放送設備 自家発電設備	防災センター機能の向上の考え方	詳細検討 設備等の詳細検討	設計 基本設計	設計 実施設計	工事 火災受信機、監視モニター、放送設備、自家発電設備	▼	
		復元基本方針	全体基本計画	反映			
		整合	整合	整合	整合		
<b>管理センター及び首里杜館増築・改修</b>	整備方針	設計 基本設計 景観検討を含む	設計 実施設計 建築審査会等を含む	工事 増築・改修工事（防火設備等を除く）	工事 国営公園との連携構築に伴う設備等の整備	▼	
		反映					
<b>その他工事等</b>		火災後の機能回復等（順次、整備・運用） 監視カメラ、中央監視装置、放送設備（城郭内・城郭外の相互連携）					➤
		工事エリアと開園エリアの連携構築に伴う設備等の整備（順次、整備・運用） 工事警備室と奉神門等の防災・防火に係る伝達系統（火災受信機、監視モニター等）					➤
		国営公園内の施設の防災・防火対策に必要な設備等の整備（順次、整備・運用） 連結送水管、新設水槽、火災受信機、監視モニター、城門の解錠等					➤
							➤

正殿単体完成時（北殿・南殿等の工事中）の運用

# 首里城公園管理体制構築計画の目次（案）

## 1. 計画の概要

- 1-1. 計画策定の趣旨                      1-2. 計画の位置づけ
- 1-3. 計画期間                              1-4. 計画の対象範囲

下線部の概要をリーフレットに掲載

赤字の項目は、県民等の意見募集後に内容を検討や追加した項目

## 2. 首里城公園の管理体制の構築に関する課題

- 2-1. 課題                                      2-2. 課題の概要

## 3. 首里城公園の管理体制の構築に向けた取組方針

- 3-1. 取組方針                              3-2. 取組の目標時点
- 3-3. 取組方針の内容

取組方針① 防災センター機能の強化

取組方針② 城郭内における初動対応の強化

取組方針③ 様々な公園利用者に配慮した避難誘導體制の再構築

取組方針④ 首里城公園に適した管理運営の確立

## 4. 首里城公園の管理体制の構築に向けた取組の工程表

- 4-1. 取組工程の考え方
- 4-2. 正殿工事期間中の取組の考え方                      4-3. 正殿単体完成時に向けた取組の考え方
- 4-4. 取組の実施工程表

## 5. 首里城公園管理体制構築計画の推進体制

- 5-1. 計画の推進体制                      5-2. 計画の見直し及び進捗管理

## 資料編

首里城公園管理体制構築検討委員会の概要

令和3年度の検討内容


用語解説

スライド右上に【第4回委員会時点（案）】と表示があるスライドの内容は計画の1～5、資料編に掲載予定。

# 首里城公園管理体制構築計画のリーフレットの構成（案）

首里城公園管理体制構築計画の概要版として、以下のとおり **8面構成** のリーフレットを作成する。  
 <構成（案）>



- 1：表紙（計画策定の趣旨）    2：取組方針（全体）    3：工程の考え方（取組の目標時点等）  
 4～5：取組の工程表    6～7：取組方針①②③④    8：裏表紙（計画の対象範囲、見直し等）

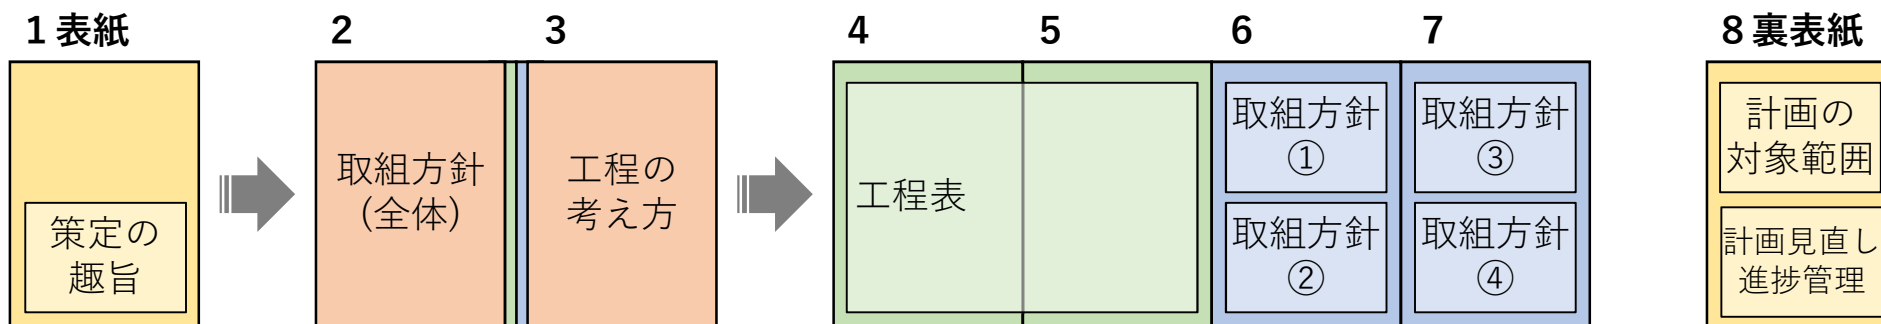

1面を左に開く

2面3面の間を左右に開く

4面5面を閉じた場合  
 (3面だけを開いた場合)

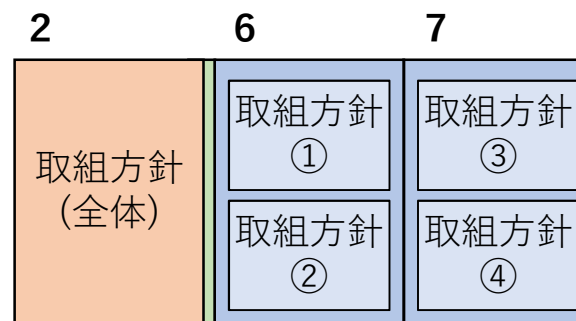

6面7面を閉じた場合  
 (2面だけを開いた場合)

## 首里城公園管理体制構築計画（案）に対する県民等意見募集の概要

- ・ **募集期間**：令和4年2月16日（水）～3月1日（火）※14日間
- ・ **周知方法**：
  - 沖縄県HPへ掲載（トップの新着情報、都市公園課のお知らせ）
  - 県政記者クラブ※へ情報提供 ※テレビ、新聞、ラジオ、通信の報道機関（26社）が加盟  
⇒ 確認できた報道状況：【新聞】沖縄タイムス 2月17日（木）
- ・ **案の閲覧方法**：
  - 【HPへ掲載】 県都市公園課のHPにPDFデータの掲載
  - 【配布】 県都市公園課にて配布
  - 【閲覧】 宮古行政情報コーナー（宮古合同庁舎1階）  
八重山行政情報コーナー（八重山合同庁舎1階）
- ・ **意見の提出方法**：
  - 【電子メール】 【FAX】 【郵送】

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・ <b>意見提出件数</b>：<br/>20件（3人・団体）      &lt;参考&gt; 首里城復興基本計画      ご意見の件数：17件（7名）</li><li>・ <b>意見への対応方針（案）</b><ul style="list-style-type: none"><li>意見者1（No.1～15）      ⇒ ご意見の趣旨を踏まえ、計画全体の体裁等を再確認の上、修正</li><li>意見者2（No.16～19）      ⇒ ご意見の趣旨を踏まえ、文章の修正等(表現の適正化、補足等)</li><li>意見者3（No.20）      ⇒ ご意見の趣旨を踏まえ、文言を追記</li></ul></li></ul> |
|---|

※ご意見及びご意見に対する対応方針は、計画の公表とあわせて、県都市公園課HPに掲載予定。
